

# Surat Penawaran

25 Juli 2019

Kepada Yth:

POKJA PEMILIHAN 13 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

di

tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Jeruk Gulung Kab. Demak

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: 009.1 /Pokjapil-13/VII/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Jeruk Gulung Kab. Demak sebesar Rp 1.985.044.257,34.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(25 Juli 2019 12:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis dan Identitas.
2. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan dari Isian LDK.
3. Rekapitulasi Perhitungan TKDN.
4. Syarat Teknis Lain (Persyaratan Teknis Lainnya sesuai Dalam LDP).
5. Daftar Kuantitas dan Harga.
6. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

**SURAT PERJANJIAN**  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
..... [diisi nama paket pekerjaan]  
Nomor : ..... [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal..... , antara:

Nama : ..... [nama PPKOM]  
NIP : ..... [NIP PPKOM]  
Jabatan : ..... [sesuai SK Pengangkatan]  
Berkedudukan di : ..... [alamat PPKOM]  
:

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... [SK pengangkatan PPKOM] selanjutnya disebut “PPKom”, dengan:

Nama : ..... [nama wakli Penyedia]  
Jabatan : ..... [sesuai akta notaris]  
Berkedudukan di : ..... [alamat Penyedia]  
Akta Notaris :  
Nomor ..... [sesuai akta notaris]  
Tanggal : ..... [tanggal penerbitan akta]  
Notaris : ..... [nama notaris penerbit akta]  
:

yang bertindak untuk dan atas nama ..... [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ..... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ..... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA**

Ruang lingkup utama pekerjaan dan tanggungjawab penyedia jasa terdiri dari:

1. ....
2. ....
3. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas dan mutu, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan pekerjaan, dan ketepatan tempat penyerahan.

### **Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan

Harga adalah sebesar Rp. .... (..... ditulis dalam huruf .....) dengan kode akun kegiatan .....

- 2) Kontrak ini dibiayai dari ..... [diisi sumber pembiayaannya];
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank .... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

#### **Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK**

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian;
  - b. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - e. spesifikasi teknis; dan
  - f. gambar-gambar.

#### **Pasal 5 MASA KONTRAK**

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ..... (... dalam huruf ...) hari kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama PPKom  
..... (diisi nama badan usaha)

Untuk dan atas nama  
PT/CV. ....

.....  
NIP. ....

.....  
Direktur/Direktur Utama


**Mengetahui :**

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

.....  
Pembina .....  
NIP. ....

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth :

- Ganda 1 : Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selaku PPKom
- Ganda 2 : Direktur ..... (PENYEDIA)
- Ganda 3 : Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 4&5 : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 6 : Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran
- Ganda 7 : Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi selaku PPTK
- Ganda 8 : Kepala Balai PU SDA TARU .....
- Ganda 9 : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 10 : Bendahara Pengeluaran Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 11 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU SDA TARU Pro. Jawa Tengah
- Ganda 12 : Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM

## SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Telp. 024-7608201, 7608342, 7621825  
Fax. 024-7612334, 7621825 (Kode Pos : 50144)

PEKERJAAN

**PERENCANAAN EMBUNG JERUKGULUNG**  
LS. SIDOWAYAH

PAKET 14

KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2018



**DAFTAR GAMBAR**  
**PERENCANAAN EMBUNG JERUKGULUNG**  
**LS. SIDOWAYAH, KABUPATEN DEMAK**

NO. HALAMAN	NO. REGISTER	JUDUL GAMBAR
1	DD - JRG - 00- 01	PETA LOKASI EMBUNG JERUKGULUNG
2	DD - JRG - 00- 02	LAYOUT EMBUNG JERUKGULUNG
3	DD - JRG - 00- 03	DATA TEKNIS EMBUNG JERUKGULUNG
4	DD - JRG - 01- 01	DENAH EMBUNG JERUKGULUNG
5	DD - JRG - 02- 01	POTONGAN MELINTANG EMBUNG 1/4
6	DD - JRG - 02- 02	POTONGAN MELINTANG EMBUNG 2/4
7	DD - JRG - 02- 03	POTONGAN MELINTANG EMBUNG 3/4
8	DD - JRG - 02- 04	POTONGAN MELINTANG EMBUNG 4/4
9	DD - JRG - 03- 01	DETAIL STRUKTUR
10	DD - JRG - 03- 02	DETAIL PENULANGAN
11	DD - JRG - 03- 03	DETAIL STRUKTUR INLET DAN KANTONG LUMPUR No.1
12	DD - JRG - 03- 04	DETAIL STRUKTUR INLET DAN KANTONG LUMPUR No.2
13	DD - JRG - 03- 05	DETAIL STRUKTUR PENULANGAN INLET DAN KANTONG LUMPUR
14	DD - JRG - 03- 06	DETAIL STRUKTUR OUTLET
15	DD - JRG - 03- 07	DETAIL STRUKTUR PELIMPAH
16	DD - JRG - 04- 01	DETAIL UTILITAS DAN FASILITAS







# DAFTAR TEKNIS EMBUNG JERUKGULUNG LS. SIDOWAYAH, KABUPATEN DEMAK

1 LOKASI	: Desa Jerukgulung, Kec. Dempet, Kab. Demak
2 KOORDINAT	: 6° 58' 2" LS ; 110° 43' 33" BT
3 LUAS TOTAL TANAH	: 3879.741 m <sup>2</sup>
4 LUAS TANGGUL KELILING EMBUNG	: 299.302 m <sup>2</sup>
5 LUAS GENANGAN AIR EMBUNG	: 2065.054 m <sup>2</sup>
6 LUAS DASAR EMBUNG	: 665.243 m <sup>2</sup>
7 VOLUME TOTAL EMBUNG	: 10621.120 m <sup>3</sup>
8 VOLUME TAMPUNGAN AIR	: 8175.743 m <sup>3</sup>
9 TINGGI EMBUNG	: 6.50 m
10 LEBAR PUNCAK TANGGUL	: 3.00 m
11 KEMIRINGAN TALUD EMBUNG	: 1 : 2
12 TINGGI PAGAR PENGAMAN	: 1.80 m
13 DIMENSI KANTONG LUMPUK 1	: 15.00 x 1.50 m
14 DIMENSI KANTONG LUMPUK 2	: 15.00 x 1.50 m
15 DIMENSI INLET	: b = 0.60 m ; h = 1.70 m
16 DIMENSI PELIMPAPAH	: b = 1.00 m ; h = 0.50 m


<b>HIDROLOGI :</b>	
1 LUAS DAS JERUKGULUNG	: 4.82 km <sup>2</sup>
2 DEBIT BANJIR RENCANA Q2	: 7.22 m <sup>3</sup> /dt
Q5	: 9.10 m <sup>3</sup> /dt
Q10	: 10.40 m <sup>3</sup> /dt
Q25	: 12.11 m <sup>3</sup> /dt
Q50	: 13.43 m <sup>3</sup> /dt
Q100	: 14.81 m <sup>3</sup> /dt
3 MANFAAT AIR BAKU	= $\frac{\text{Vol. Tampunguan Waduk}}{60 \text{ lt / hari / orang}}$
	= $\frac{8175.743 \times 1000}{60}$
	= 136262 Jiwa

**KETERANGAN :**

1. Data didapat dari hasil pengukuran menggunakan TS.
2. Koordinat didapat dari konversi data pengukuran dengan TS.
3. Data diatas disesuaikan dengan gambar desain yang telah direncanakan.

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> <b>SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG</b></p> <p><small>Jl. Sekeloa No. 41, Semarang, Jawa Tengah 50132 Telp. (061) 521393, 521394, 521395, 521396, 521397, 521398, 521399, 521400, 521401, 521402, 521403, 521404, 521405, 521406, 521407, 521408, 521409, 521410, 521411, 521412, 521413, 521414, 521415, 521416, 521417, 521418, 521419, 521420, 521421, 521422, 521423, 521424, 521425, 521426, 521427, 521428, 521429, 521430, 521431, 521432, 521433, 521434, 521435, 521436, 521437, 521438, 521439, 521440, 521441, 521442, 521443, 521444, 521445, 521446, 521447, 521448, 521449, 521450, 521451, 521452, 521453, 521454, 521455, 521456, 521457, 521458, 521459, 521460, 521461, 521462, 521463, 521464, 521465, 521466, 521467, 521468, 521469, 521470, 521471, 521472, 521473, 521474, 521475, 521476, 521477, 521478, 521479, 521480, 521481, 521482, 521483, 521484, 521485, 521486, 521487, 521488, 521489, 521490, 521491, 521492, 521493, 521494, 521495, 521496, 521497, 521498, 521499, 521500</small></p>	
<b>DATA TEKNIS</b>	
GAMBAR : EMBUNG JERUKGULUNG	
CV. SEMBADA DISAIN Jl. Sekeloa No. 41, Semarang, Jawa Tengah 50132 Telp. (061) 521393, 521394, 521395, 521396, 521397, 521398, 521399, 521400, 521401, 521402, 521403, 521404, 521405, 521406, 521407, 521408, 521409, 521410, 521411, 521412, 521413, 521414, 521415, 521416, 521417, 521418, 521419, 521420, 521421, 521422, 521423, 521424, 521425, 521426, 521427, 521428, 521429, 521430, 521431, 521432, 521433, 521434, 521435, 521436, 521437, 521438, 521439, 521440, 521441, 521442, 521443, 521444, 521445, 521446, 521447, 521448, 521449, 521450, 521451, 521452, 521453, 521454, 521455, 521456, 521457, 521458, 521459, 521460, 521461, 521462, 521463, 521464, 521465, 521466, 521467, 521468, 521469, 521470, 521471, 521472, 521473, 521474, 521475, 521476, 521477, 521478, 521479, 521480, 521481, 521482, 521483, 521484, 521485, 521486, 521487, 521488, 521489, 521490, 521491, 521492, 521493, 521494, 521495, 521496, 521497, 521498, 521499, 521500	Ditencana : Ir. Muband P. Team Leader : Ir. Suharto W. M. Ling Direksi/Kasi SID : Ir. Suwondo, MT. Kabid PPT : Ir. Lukito, Sp.1
No. Registrasi : DD-IRG-00-03 No. Kontrak : 611/2914 Tanggal : 20 Juli 2018	No. Registrasi : DD-IRG-00-03 No. Kontrak : 611/2914 Tanggal : 20 Juli 2018

TIK	X	Y	Z
BM.SM.03	469718.880	9229876.972	+24.481
BM.SM.04	469730.988	9229874.580	+23.531
IP1	469720.837	9229795.086	
IP2	469729.118	9229839.137	
IP3	469789.966	9229840.713	
IP4	469784.912	9229794.384	
P1	469807.403	9229843.803	
P2	469805.874	9229828.550	
P3	469792.184	9229825.569	
P4	469787.233	9229782.827	
P5	469768.548	9229783.648	
P6	469759.534	9229791.073	
P7	469718.091	9229791.536	
P8	469727.659	9229841.473	
I1	469717.271	9229793.586	
I2	469735.032	9229798.254	
I3	469786.335	9229827.930	
I4	469784.338	9229807.033	
P1.1	469723.441	9229870.969	
P1.2	469727.377	9229824.736	
O1	469785.993	9229833.901	
O2	469774.693	9229825.671	
OP1	469724.446	9229842.044	
OP2	469713.725	9229785.572	
OP3	469714.759	9229782.600	

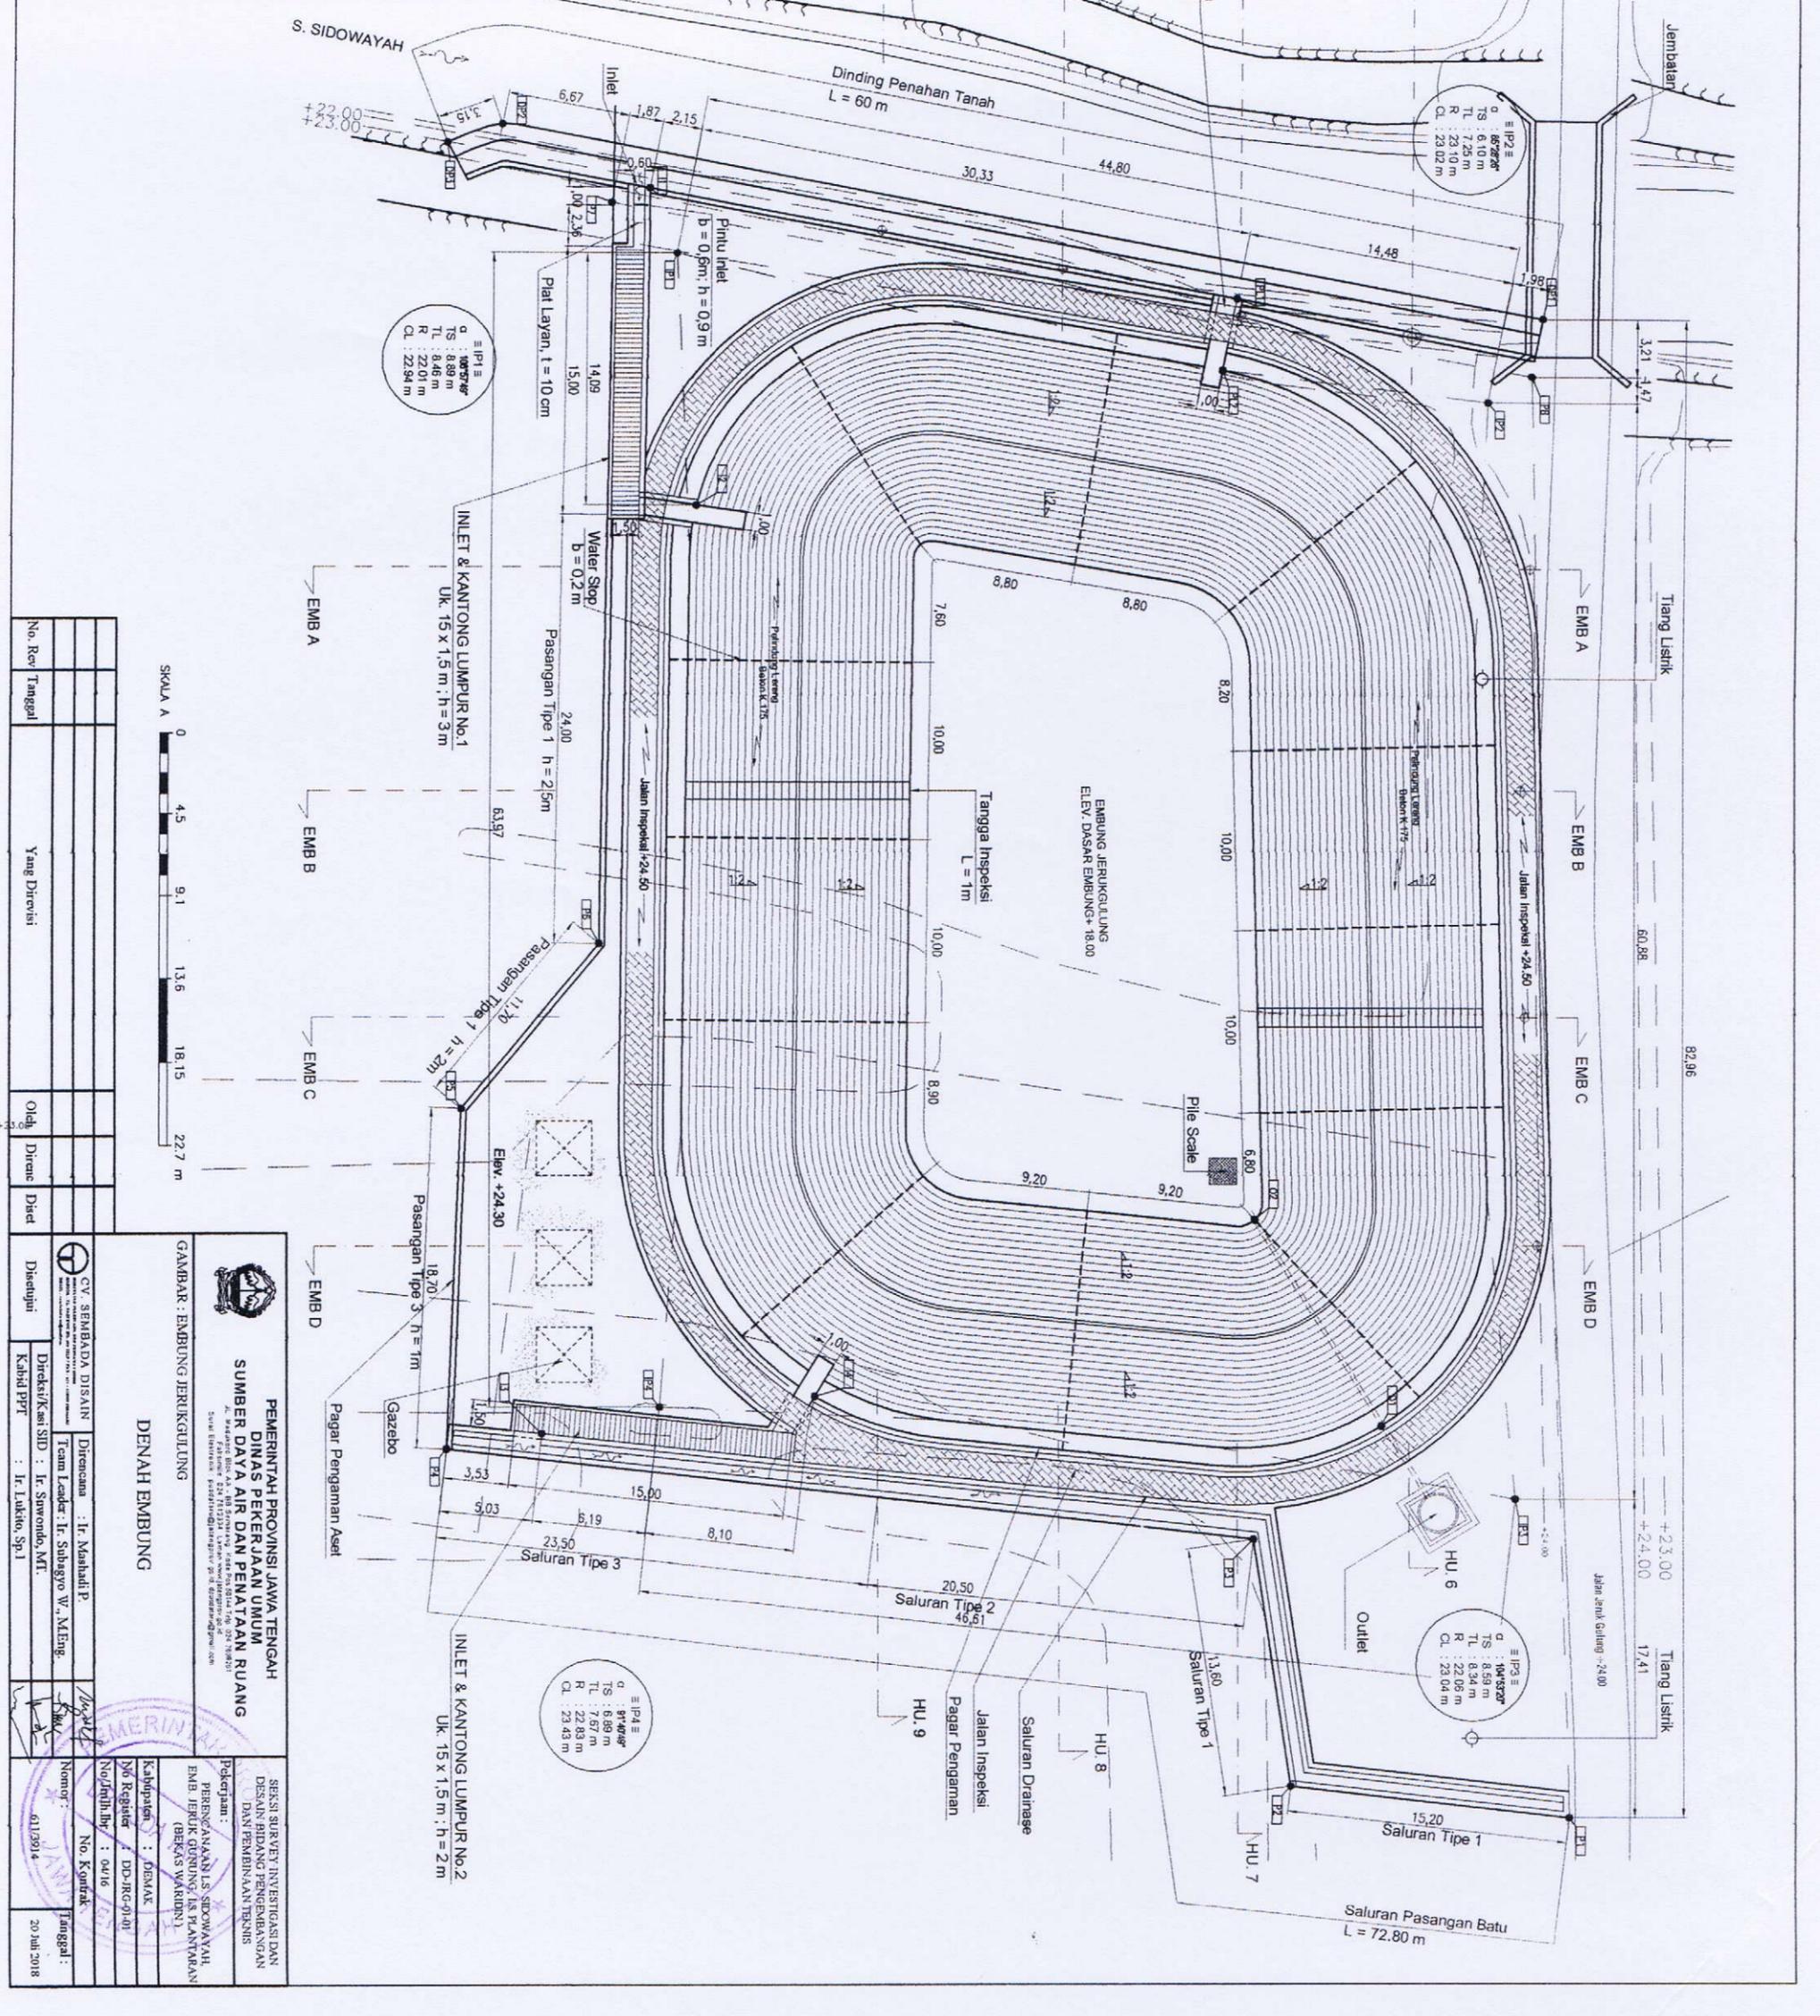

No. Rev	Tanggal	Yang Direvisi	Old	Dicant	Dicant

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PERKAWAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

**DENAH EMBUNG**


GAMBAR : EMBUNG JERUKGULUNG

CV. SEBABADA DISAIN  
 Dirancang : Ir. Mubandj.P.  
 Team Leader: Ir. Subagyo W. M.Eng.  
 Diteknologi: Ir. Sunanda M.T.  
 Kabid PPT : Ir. Lukito Sp.1


SEKSI SURVEY INVESTIGASI DAN PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN TERNS

PEKERJAAN : PERENCANAAN L.S. SIDOWAYAH, EMB. JERUK GURUNG, L.S. PLANTARAN (BEKAS WARIDNI)

Kabupaten : DEWAK  
 No. Register : DD-IRG-01/01  
 No. Anj. Irb : 04/16  
 No. Kontrak :  
 Tanggal : 20 Juli 2018

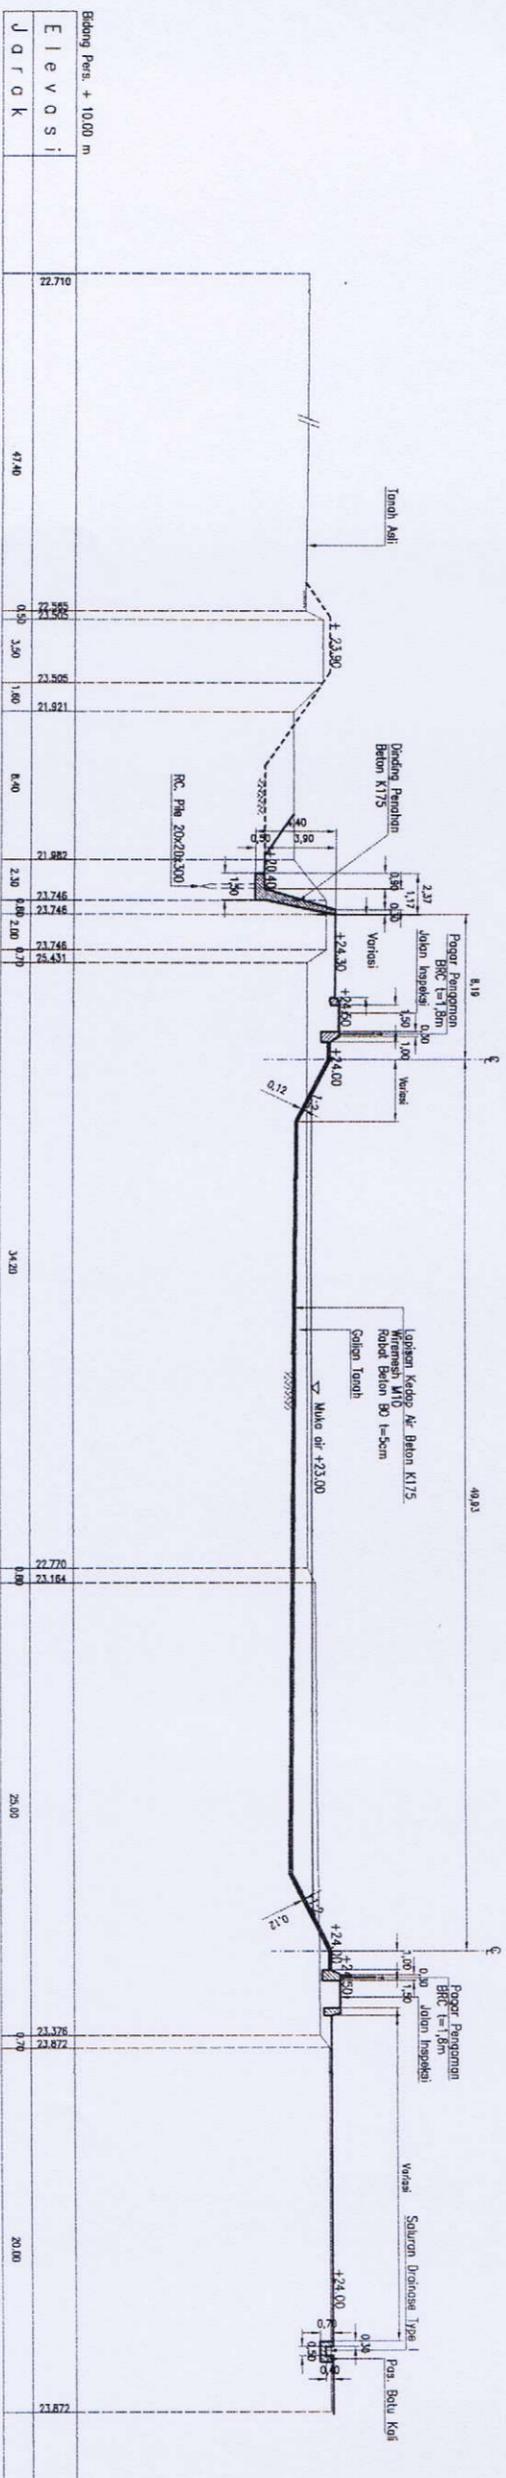

HU.6

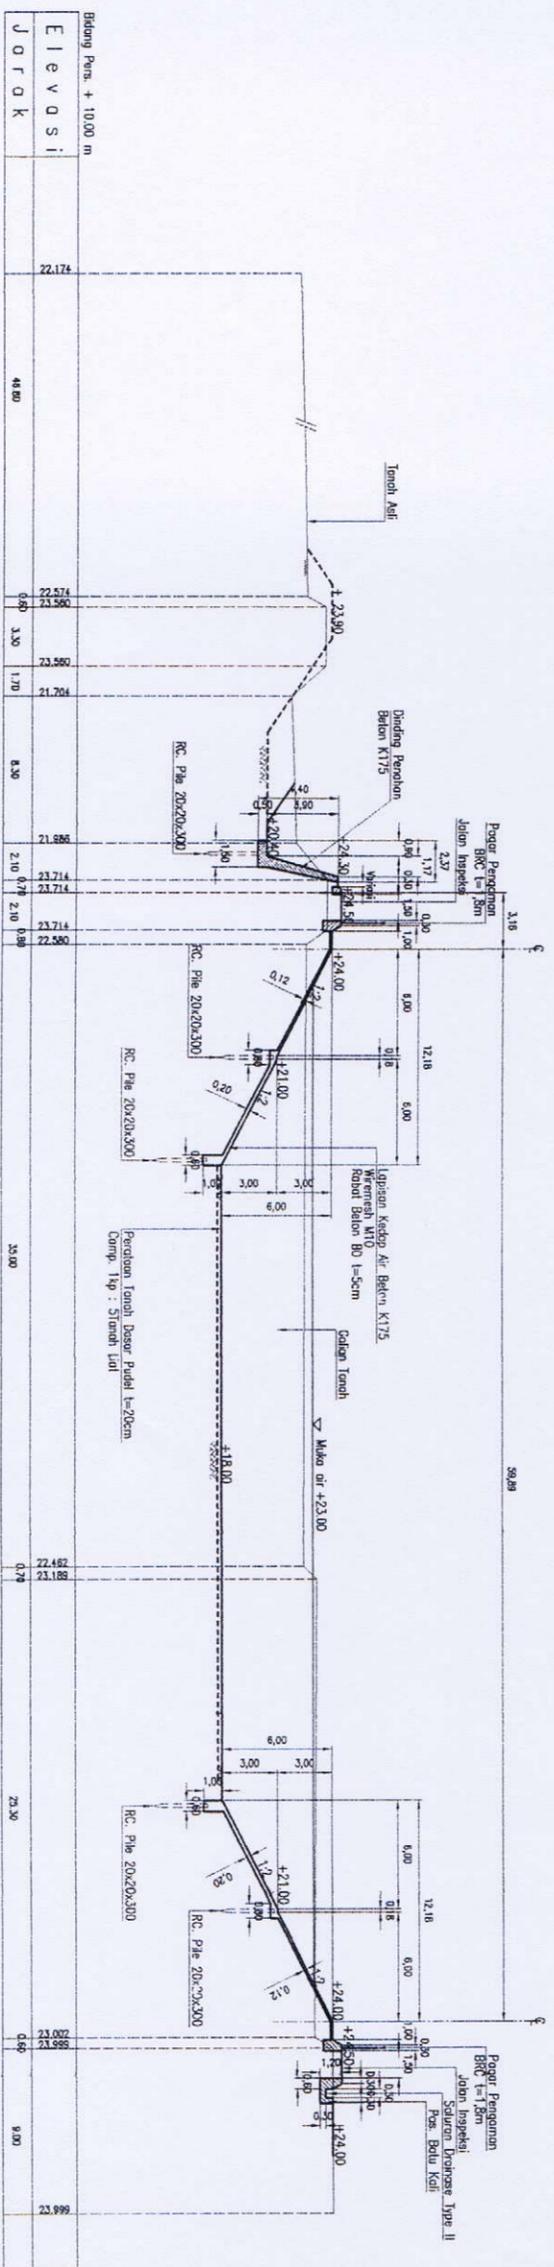

HU.7



No. Rev	Tanggal	Yang Diarsip	Oleh	Ditane	Diket

**POTONGAN CROSS**

**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

PENERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEREKONOMIAN DAN  
DAN PEMBINAAN TERKIN

KABUPATEN : DEMAK  
No. Register : DD-RCG-02/01  
No. Jmlh/lkr : 0316  
No. Kontak :  
Tanggal : 20 Mei 2018


GAMBAR : EMBUNG JERUK GELUNG

POTONGAN CROSS


PENGANTAR : PERENCANAAN I.S. SUDAWAH,  
EMR. JURUK GONDONG, I.S. PLANTIKAN  
(GENES WAKILAH)

CV. SEMBAYA DISAIN  
Jl. Sekeloa No. 111/112A, Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 50514  
Telp. (021) 8111111, Fax. (021) 8111111, Email: info@sembayadisain.com


Dibuat oleh : Ir. Masduki P.  
Ditandatangani : Ir. Subagyo W. M. Eng.  
Direktur/Kasir SID : Ir. Surodono, MT.  
Kahid PPT : Ir. Lukito, Sp.1

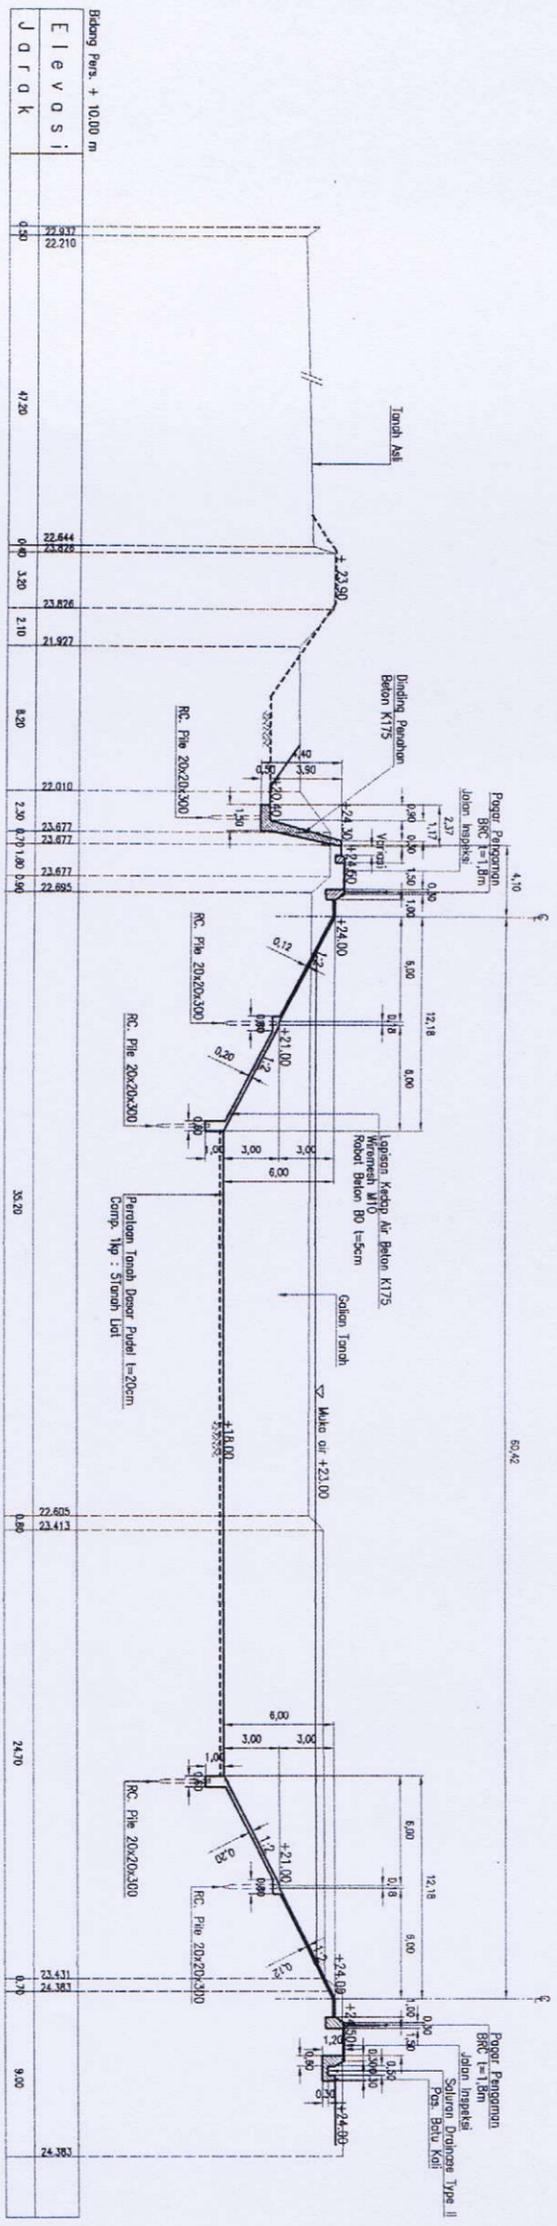

HU.8

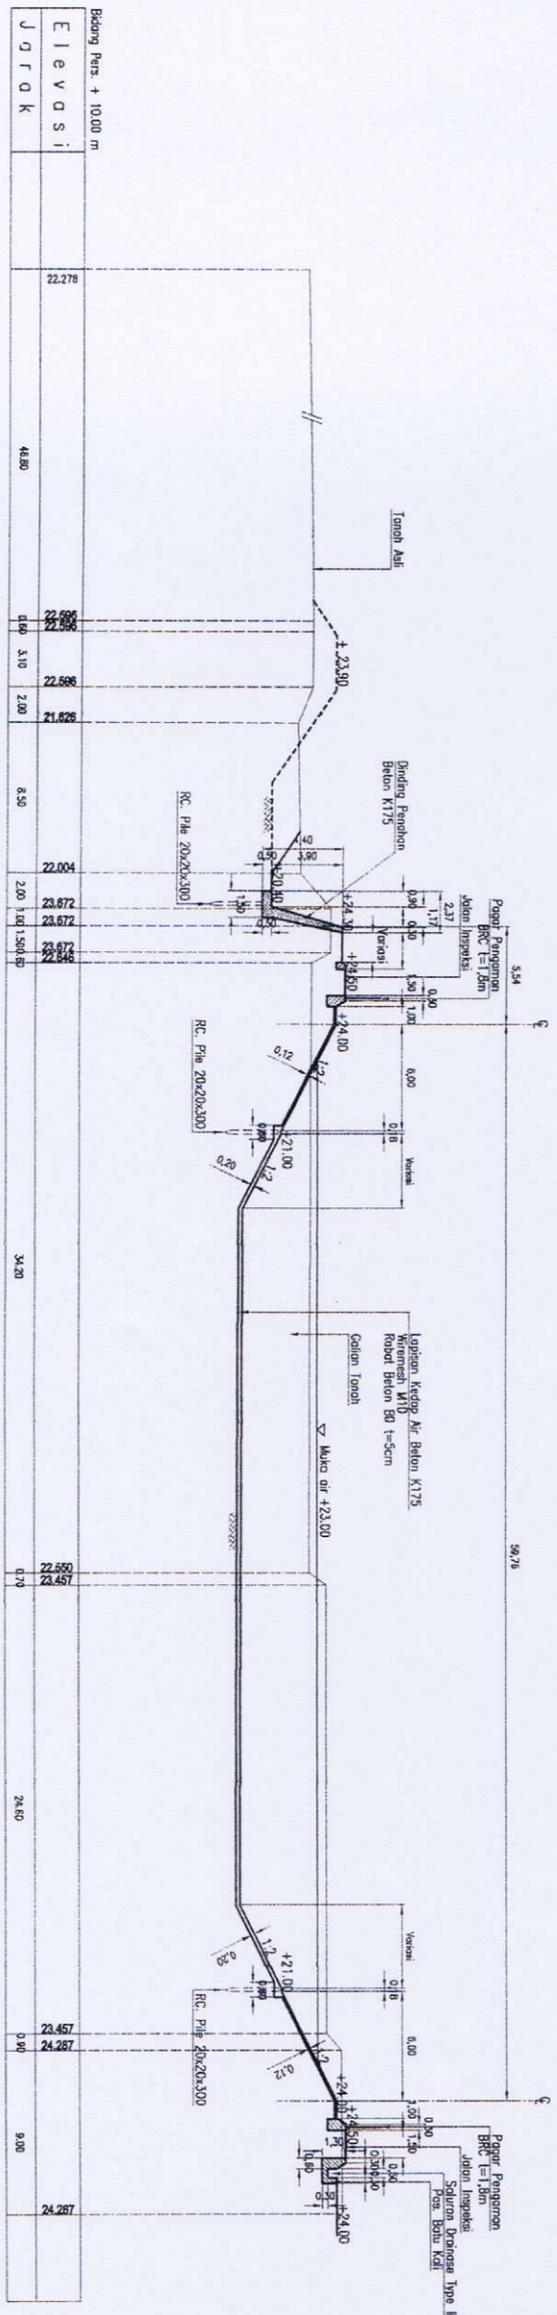

HU.9



No. Rev	Tanggal	Yang Direvisi	Oleh	Dicorek	Dibuat	Ditandatangani	Kabid PPT


**PENERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**  
 21, Mestika Blok A, Jl. Surokondo Km 10,34, Telp. 024 849201  
 Email: esd@sdair.pjt.go.id, pda@sdair.pjt.go.id, pda@sdair.pjt.go.id

**POTONGAN CROSS**  
 GAMBAR : EMBUNG JERUK GILUNG


CV SEMBADA DISAIN  
 Dirut: I. Mashadi P.  
 Team Leader: I. Suhayyo W. M. Eng.  
 Direktur: I. Suhayyo W. M. Eng.  
 Kabid PPT: I. Lukito, Sp.1

SEKSI SURVEY INVESTIGASI DAN  
 DESAIN BIDANG PERENCANAAN  
 DAN PEMERIKSAAN TEKNIS  
 PERENCANAAN (S. SIDOWAYAH,  
 EMB. JERUK GUNUNG, IS. P. ANWARAH,  
 (BERKAS WARDINI))  
 Kabupaten : DEMAK  
 No. Register : DD-RG-02-02  
 No. Kontrak :  
 Tanggal : 20 Juli 2018



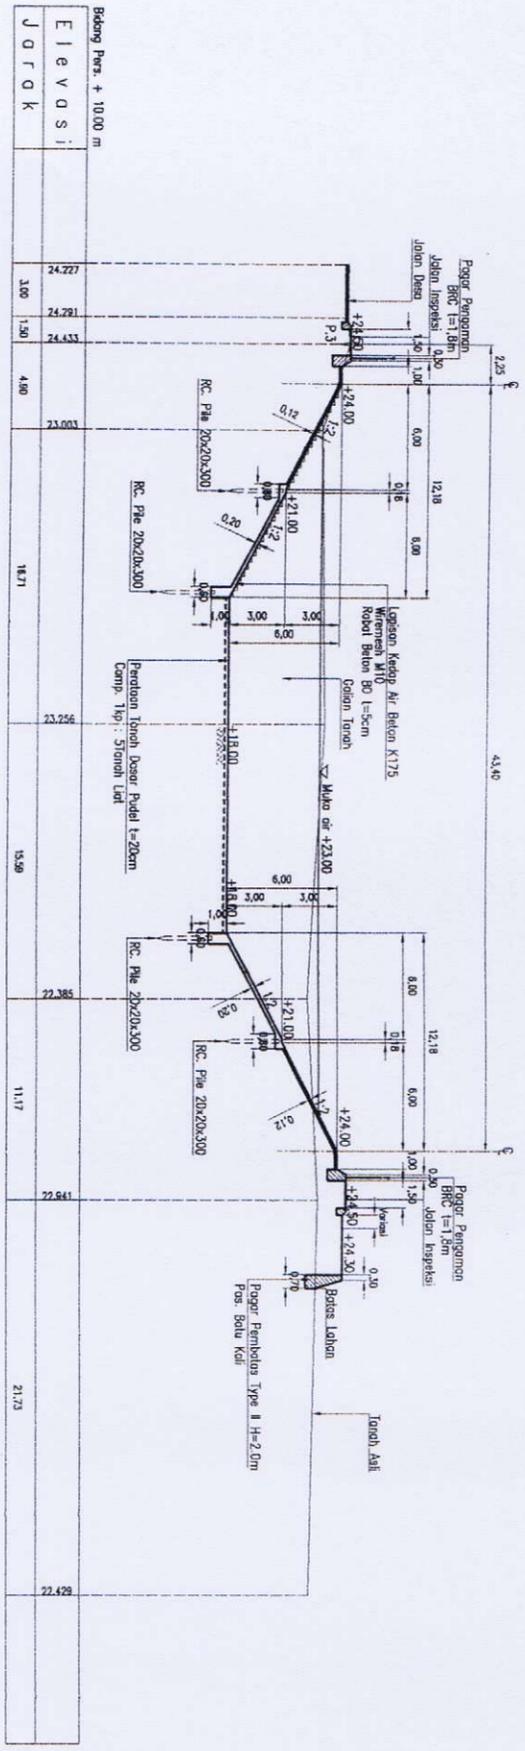

EMB. C-C

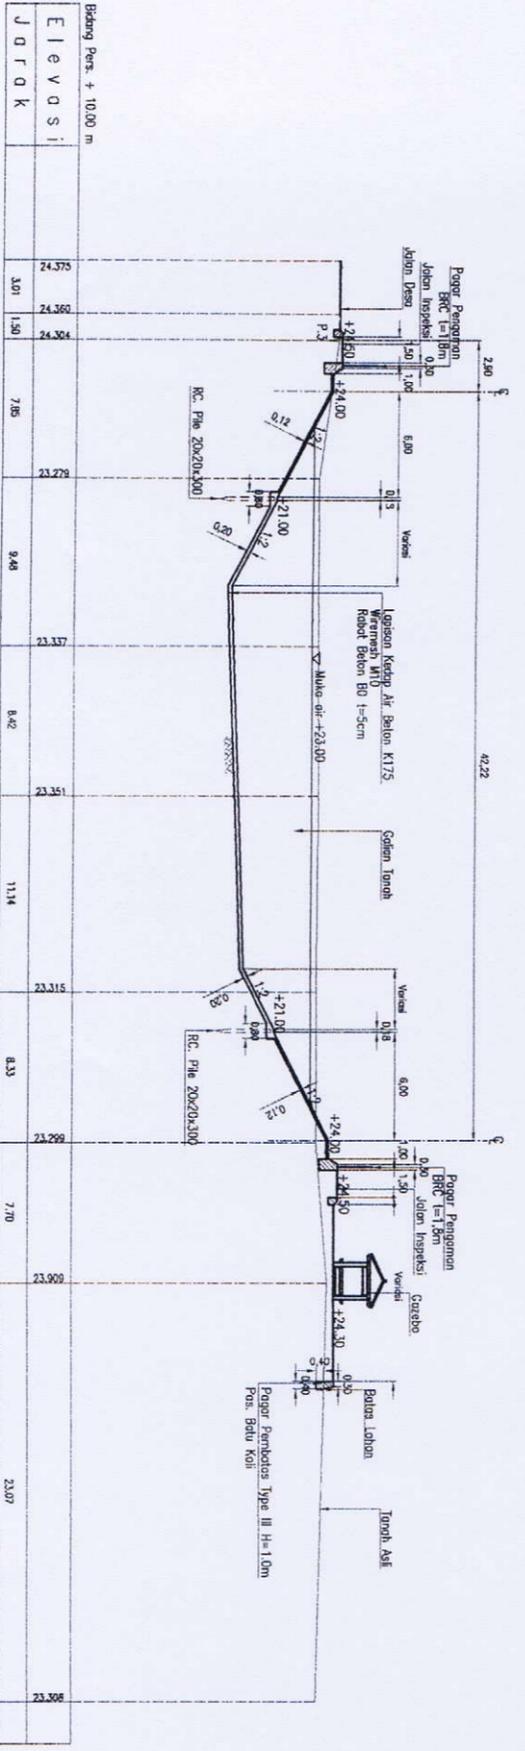

EMB. D-D

Bidang Pers. + 10,00 m	Elevasi	Jarak
	24.575	3.01
	24.360	1.50
	24.242	7.85
	23.278	9.48
	23.337	8.82
	23.357	11.14
	23.315	8.33
	23.289	7.70
	23.909	23.87



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Merdeka Raya, 50121 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
 Telp. (61) 521041, 521042, 521043, 521044, 521045, 521046, 521047, 521048, 521049, 521050, 521051, 521052, 521053, 521054, 521055, 521056, 521057, 521058, 521059, 521060, 521061, 521062, 521063, 521064, 521065, 521066, 521067, 521068, 521069, 521070, 521071, 521072, 521073, 521074, 521075, 521076, 521077, 521078, 521079, 521080, 521081, 521082, 521083, 521084, 521085, 521086, 521087, 521088, 521089, 521090, 521091, 521092, 521093, 521094, 521095, 521096, 521097, 521098, 521099, 521100

**SEKSI SURVEY INVESTIGASIDAN**  
**DESAAN BIDANG PENGELOMPOKAN**  
**DAN PEMBINAAN TEKNIK**  
**PERENCANAAN/AS STORIRAH**  
**EMB. JERUK GUNDUNG, LS. P. AYITAN**  
**(BERKAS WARDIND)**


**GAMBAR : EMBUNG JERUK GUNDUNG**  
**POTONGAN CROSS**

CV SEMBADA DISAIN  
 Disetujui: Kabid PPT


Disetujui: Kabid PPT

Direktora : Ir. Mashudi P.  
 Team Leader : Ir. Suhayyo W., M.Eng.  
 Ir. Lukito Sp.1


No. Kontrak : 08/16  
 No. Register : DD-JRG-02/24  
 No. Perizinan : 611/2914  
 Tanggal : 20 Juli 2018

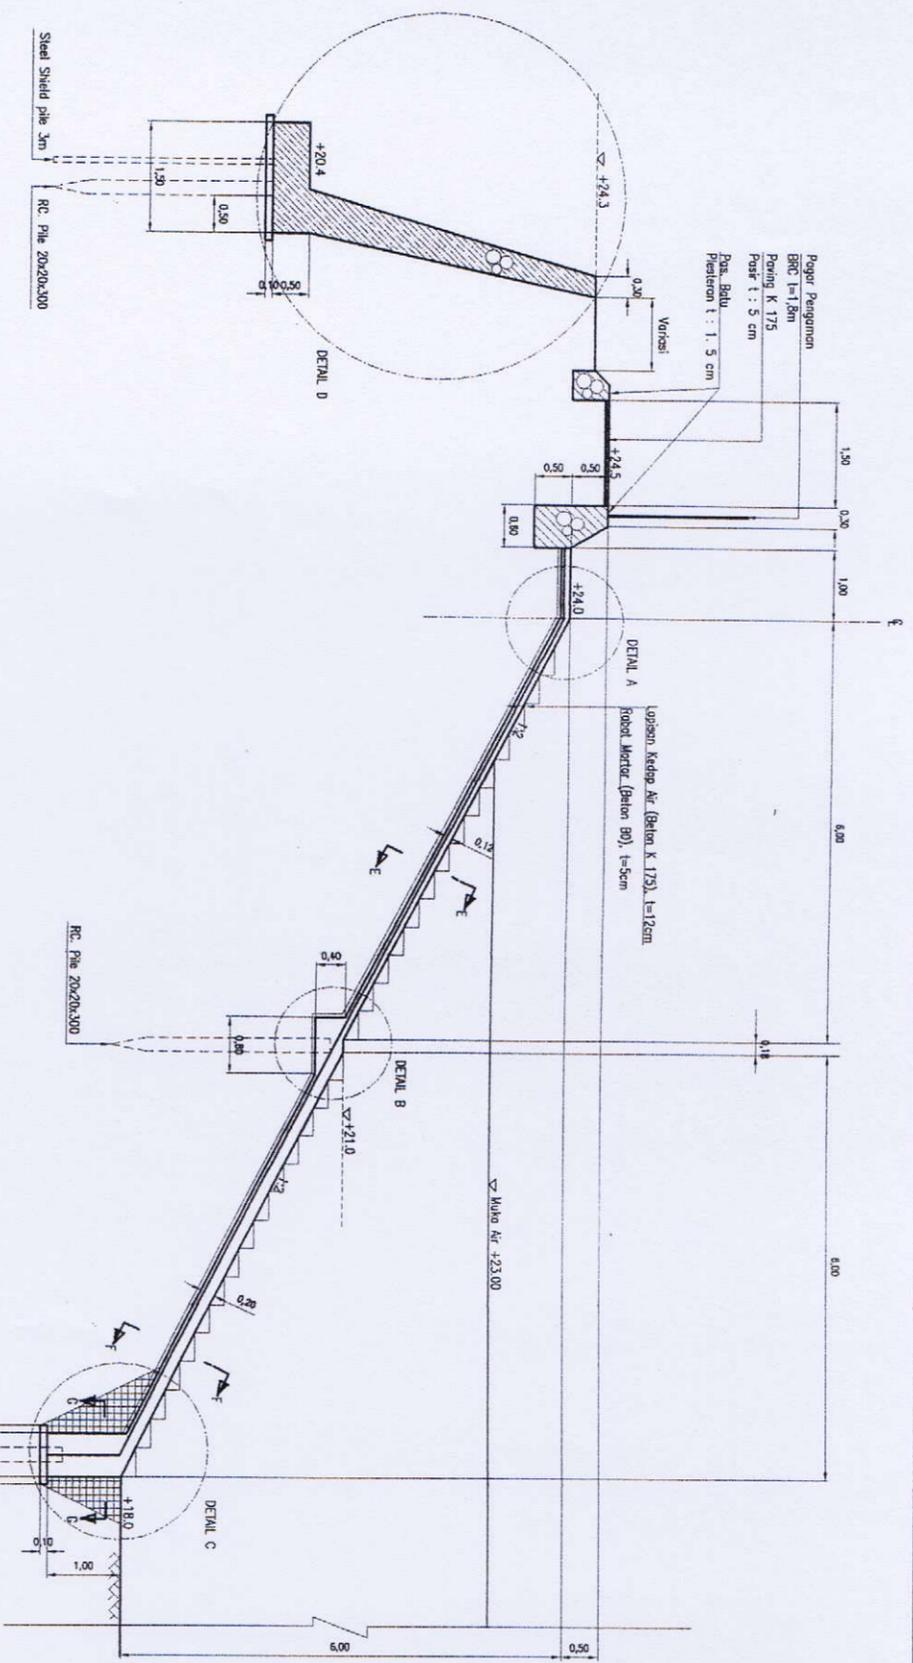

TIPICAL POTONGAN MELINTANG EMBUNG  
SKALA A

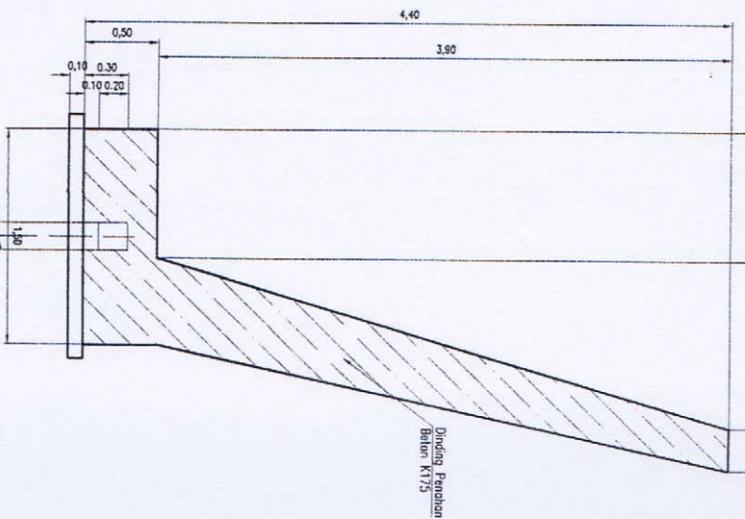


DETAIL D  
SKALA B

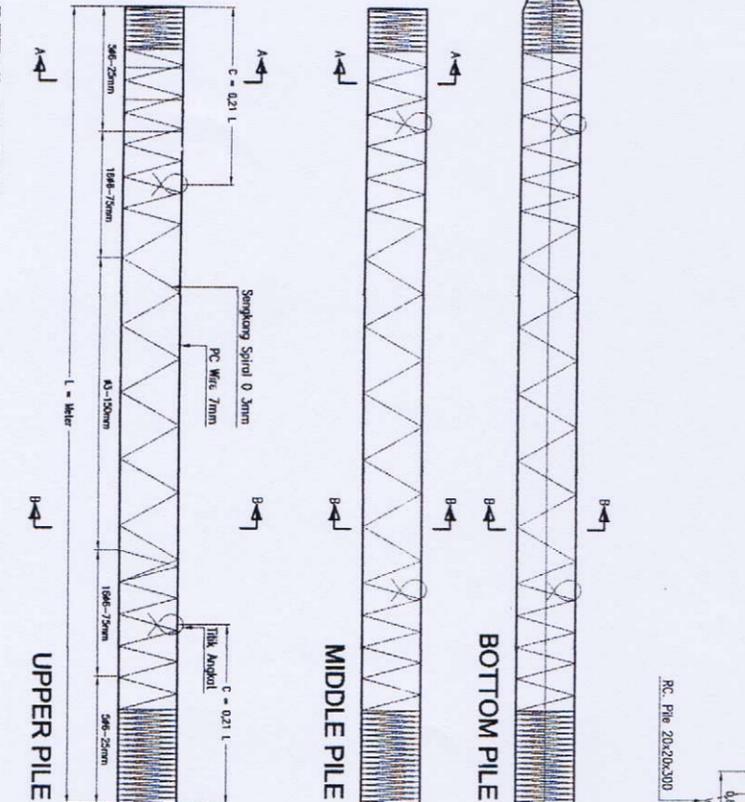


DETAIL RC PILE  
SKALA C

No. Rev	Tanggal	Yang Direvisi	Oleh	Direnc	Diseet


DETAIL A  
SKALA B

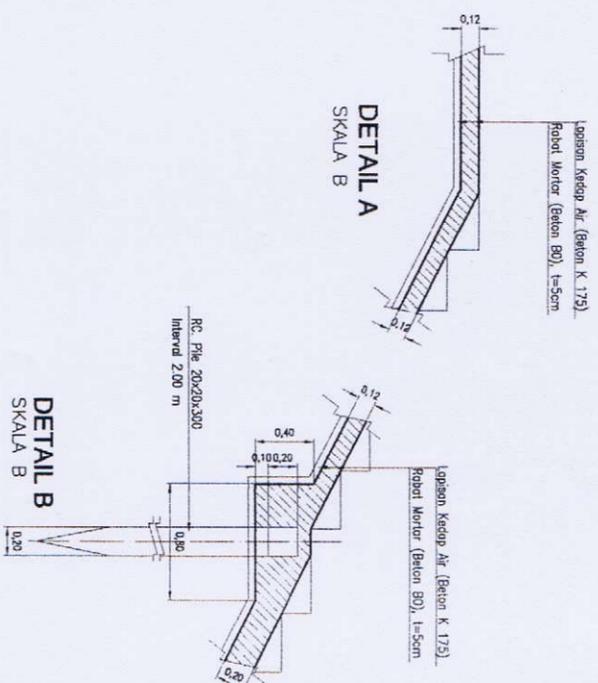


DETAIL B  
SKALA B

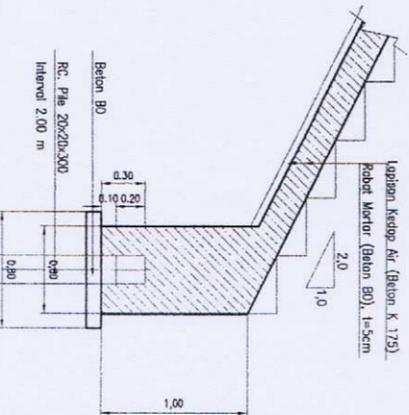




POTONGAN A-A  
SKALA C



POTONGAN B-B  
SKALA C



DETAIL JOINT  
SKALA A






PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERKULIAHAN DAN PENYIARAN  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

REVISI: 1  
NO. REGISTRASI: DD-REG-09-01  
NO. JMLH. ITR: 0916  
NO. KONTAK: 011/2914


CV SEMBADA DISAIN  
DIREKTOR/KASI SID : Ir. Sunanda, MT.  
TEAM LEADER : Ir. Subagyo W., M.Eng.  
DIREKTOR/KASI SID : Ir. Lukito, Sp.1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERKULIAHAN DAN PENYIARAN  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

REVISI: 1  
NO. REGISTRASI: DD-REG-09-01  
NO. JMLH. ITR: 0916  
NO. KONTAK: 011/2914

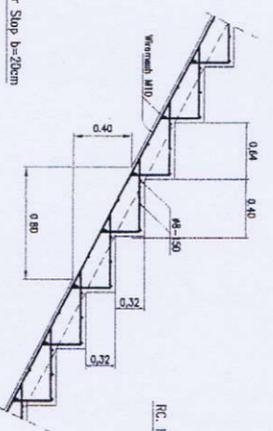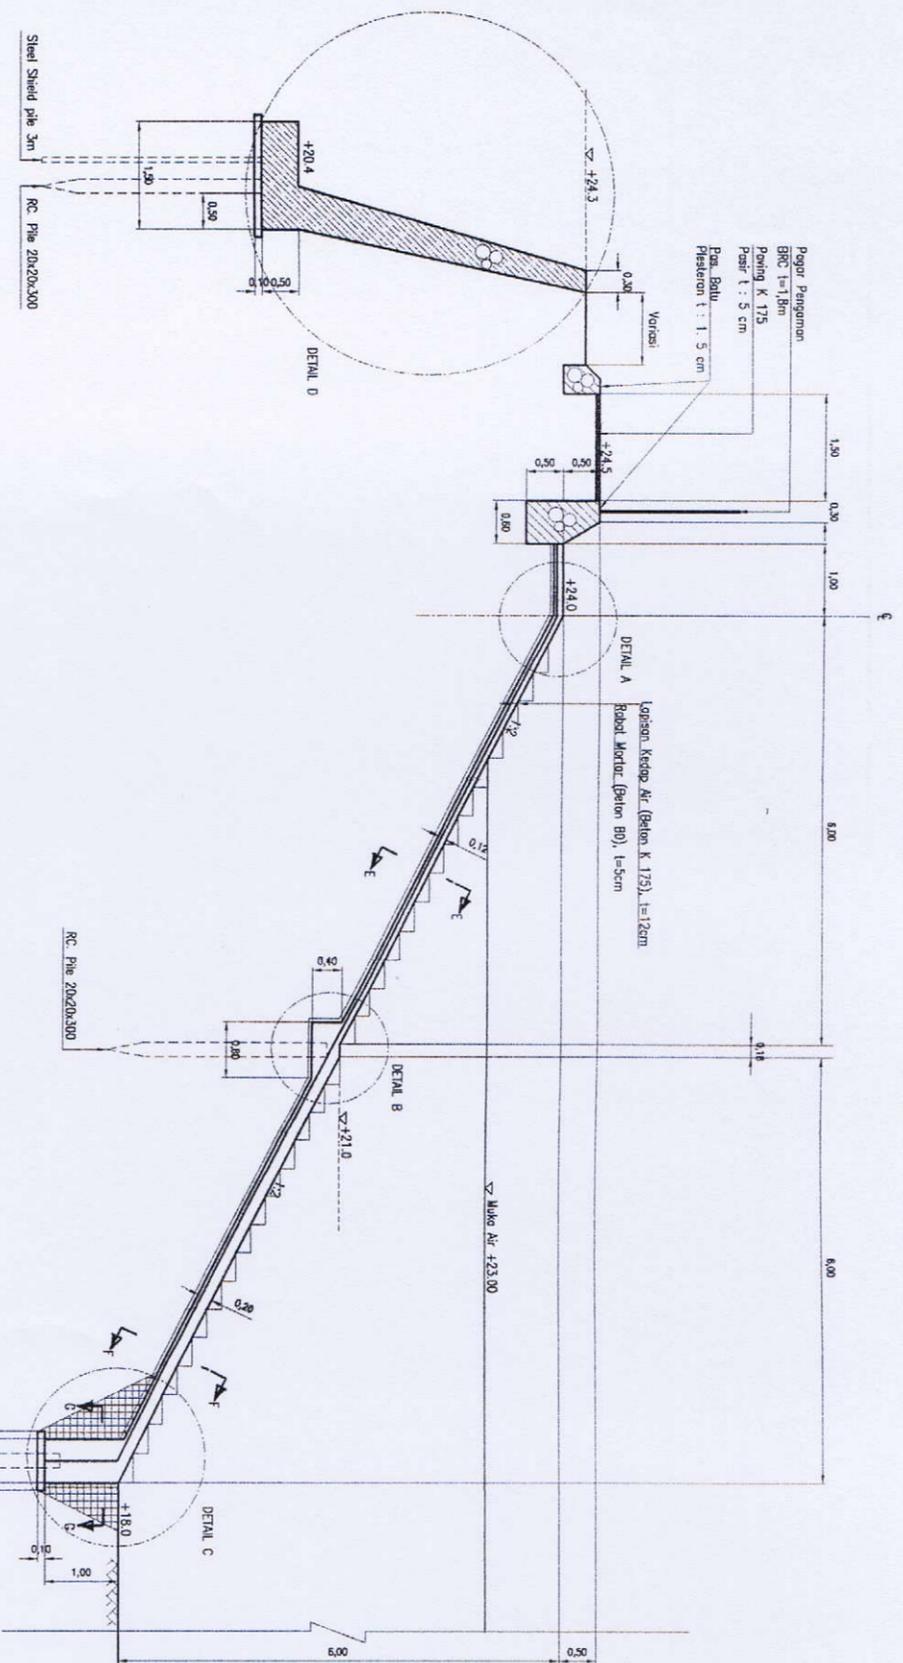

DETAIL POTONGAN G - G (SKALA C)








No. Rev	Tanggal	Yang Direvisi	Oldi	Ditrece	Dibuat

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PERKURHAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**  
 GABBAR : EMBUNG JERUK GILUNG  
 DETAIL PENULLANGAN

C.V. SEMBADA DISAIN  
 Diresponsi : Ir. Susanto, MT.  
 Team Leader : Ir. Subagio W. M. Eng.  
 Direksi PPT : Ir. Lakto, Sp.1

Dikembangkan : Ir. Maslidi P.  
 No. Registrasi : DD-JRC-03-02.  
 Notaris/Inlitr : 10116  
 No. Kontak :  
 Tanggal : 20 Juli 2018

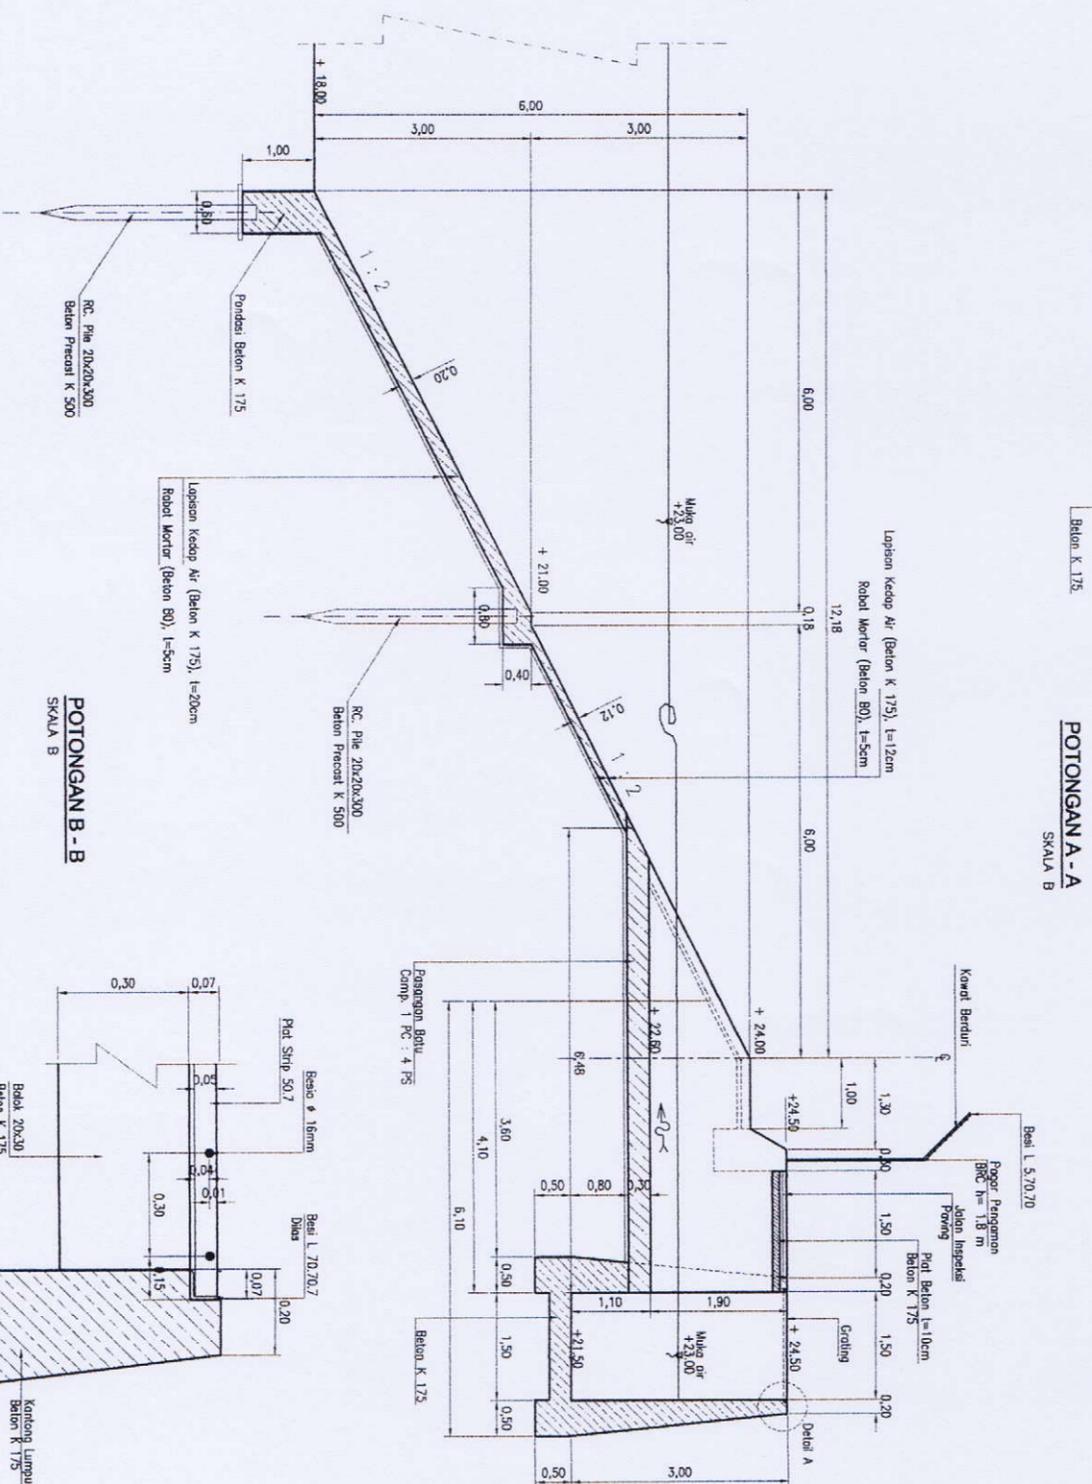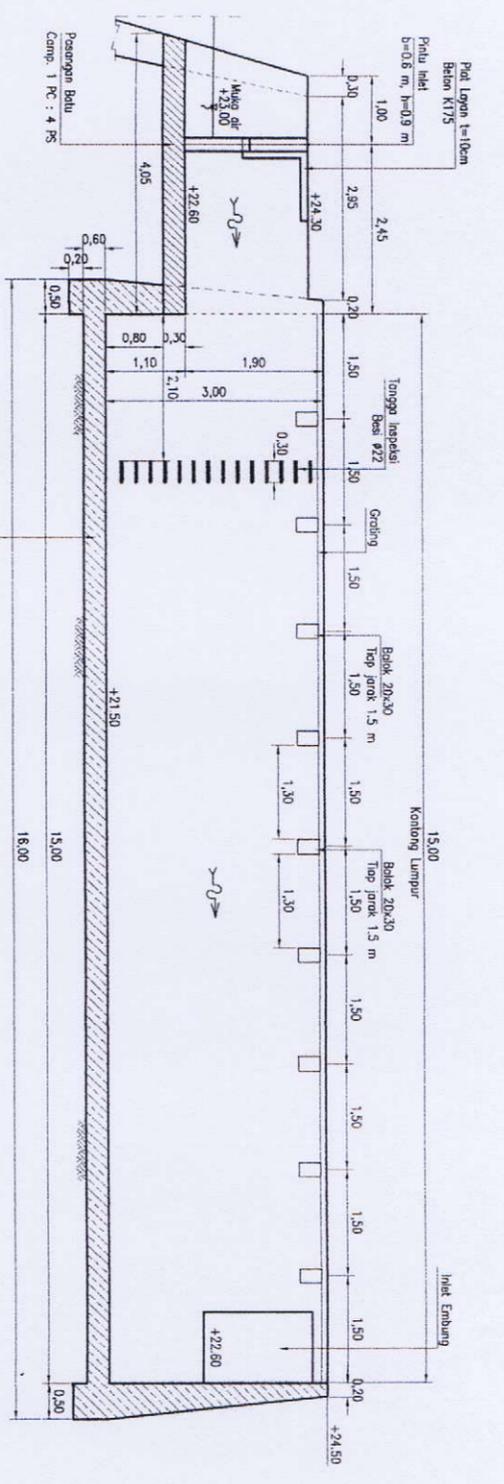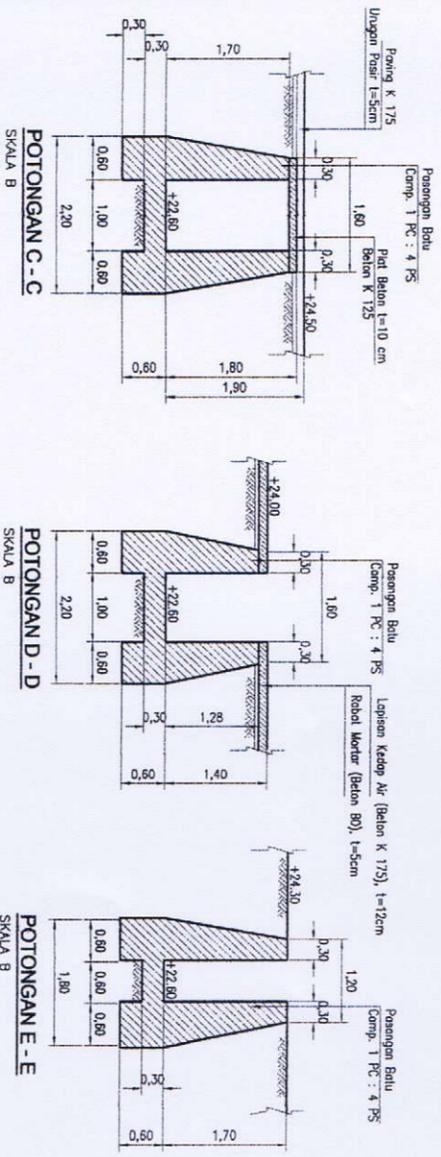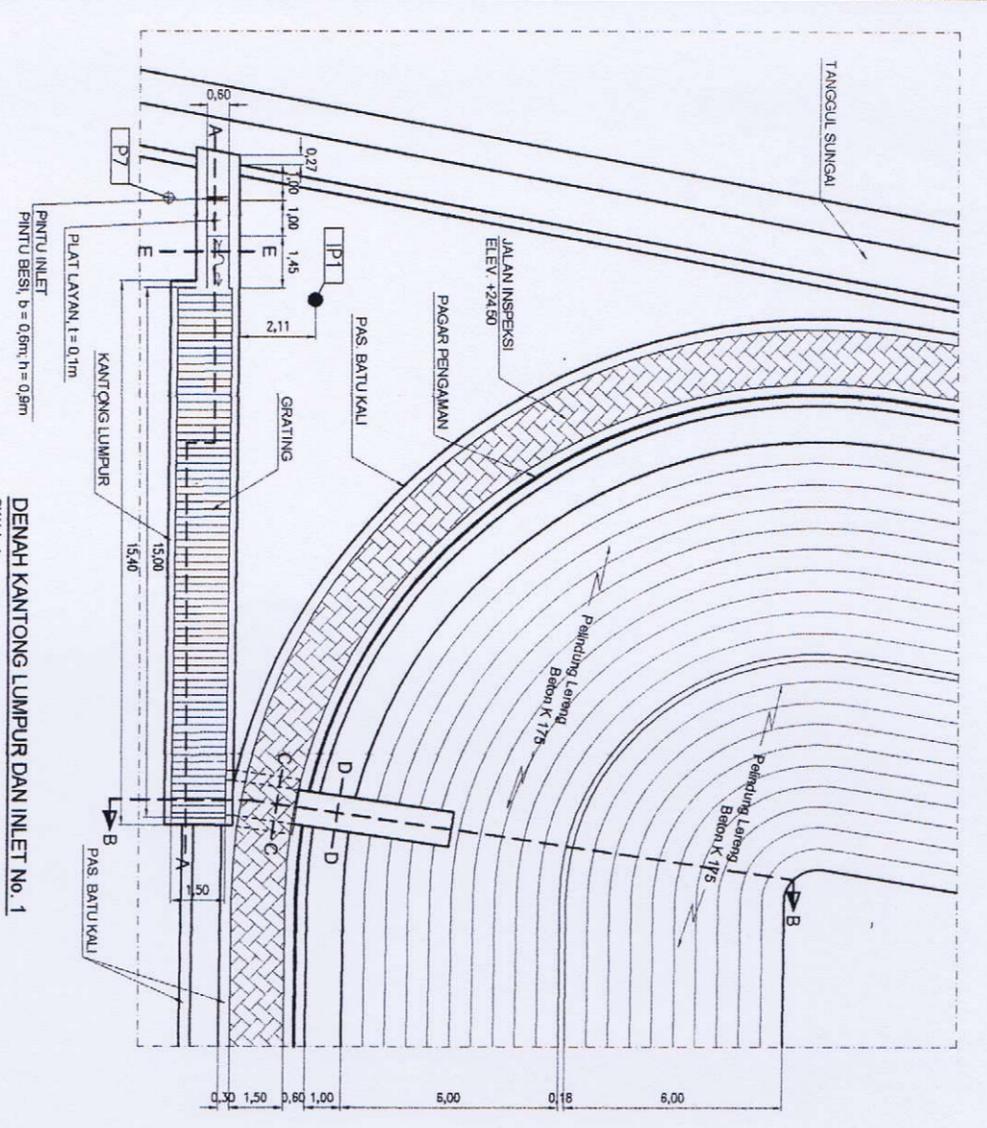

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PERENCANAAN UMUM DAN**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

**DETAIL STRUKTUR**  
**INLET DAN KANTONG LUMPUR NO.1**





GAMBAR : EMBUNG JERIKGALUNG

CV. SAKRAJAYA DIKARIR  
Jl. Surodono, MT. H. Sawandjo, MT.  
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Desain: I. Nurul Huda, P. M. H. H.  
Dibuat: I. Nurul Huda, P. M. H. H.  
Korosi: I. Nurul Huda, P. M. H. H.

No. Kencana: 6110994  
Tanggal: 20 Juli 2018




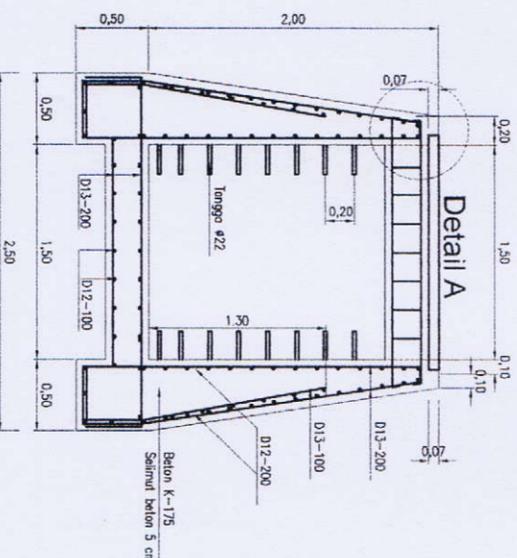
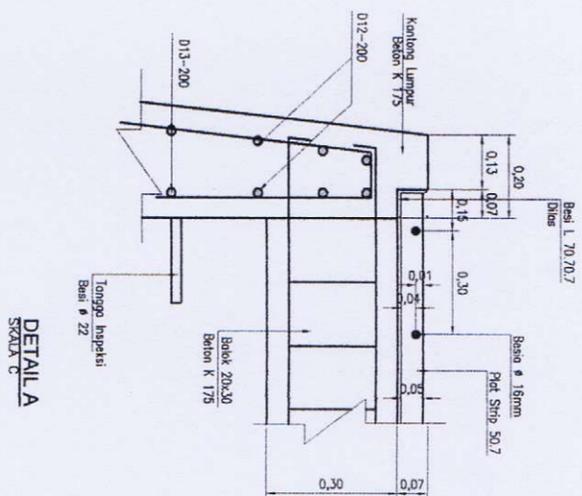
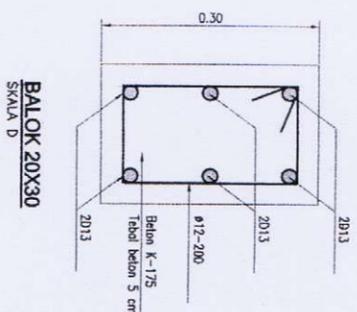
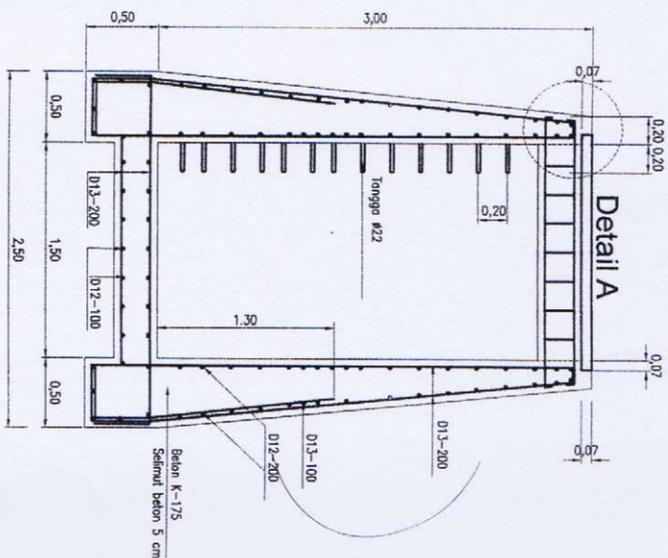


DETAIL PENULANGAN  
KANTONG LUMPUR 1  
SKALA B

BALOK 20X30  
SKALA D

DETAIL A  
SKALA C

DETAIL PENULANGAN  
KANTONG LUMPUR 2  
SKALA B

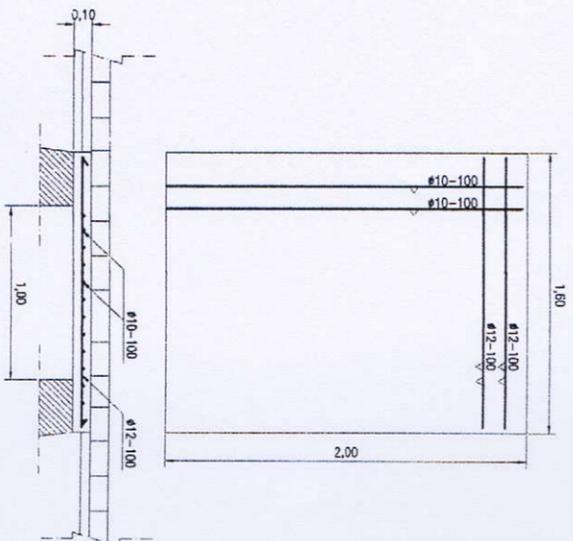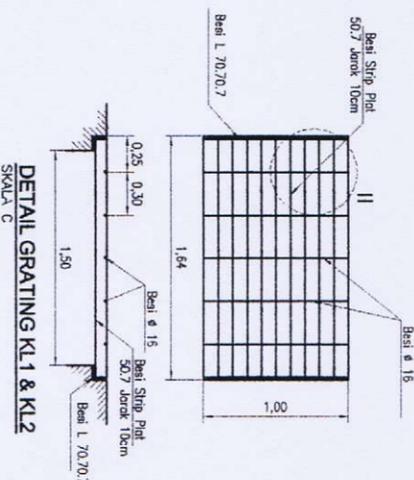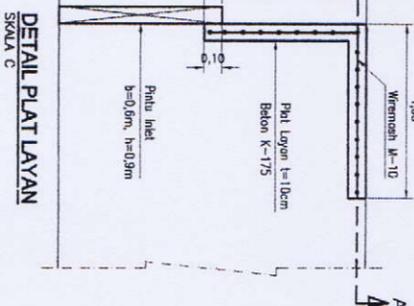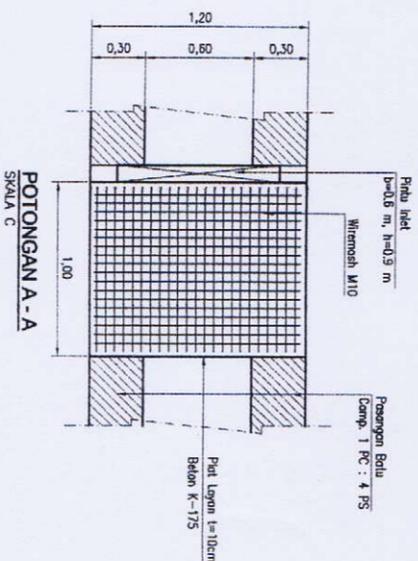

DETAIL PENULANGAN PLAT INLET 1 & INLET 2  
SKALA C

DETAIL GRATING KL 1 & KL 2  
SKALA C

SKALA A  
0 0.156 0.325 0.45 0.625 0.75 m

SKALA B  
0 0.625 1.25 1.875 2.5 3.125 m

SKALA C  
0 0.50 1 1.5 2 2.5 m

SKALA D  
0 0.313 0.625 0.913 1.25 1.563 m

No. Keel / Tanggal	Yang Direvisi	Obdi	Direksi	Chief

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
DEPT. PERENCANAAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SURABAYA


GAMBAR : EMBUNG JERUKGADING  
DETAIL PENULANGAN  
INLET DAN KANTONG LUMPUR

CV. SEMBADA BIRAH  
Jl. Lido, Sp 1  
Kediri, Jawa Timur

Desain: Ir. Muband P.  
Dibuat: Ir. Saibanyo W. M. Eng.  
Korod PPT : Ir. Ludo, Sp 1


Revisi: 01/1994

20 Aug 2018

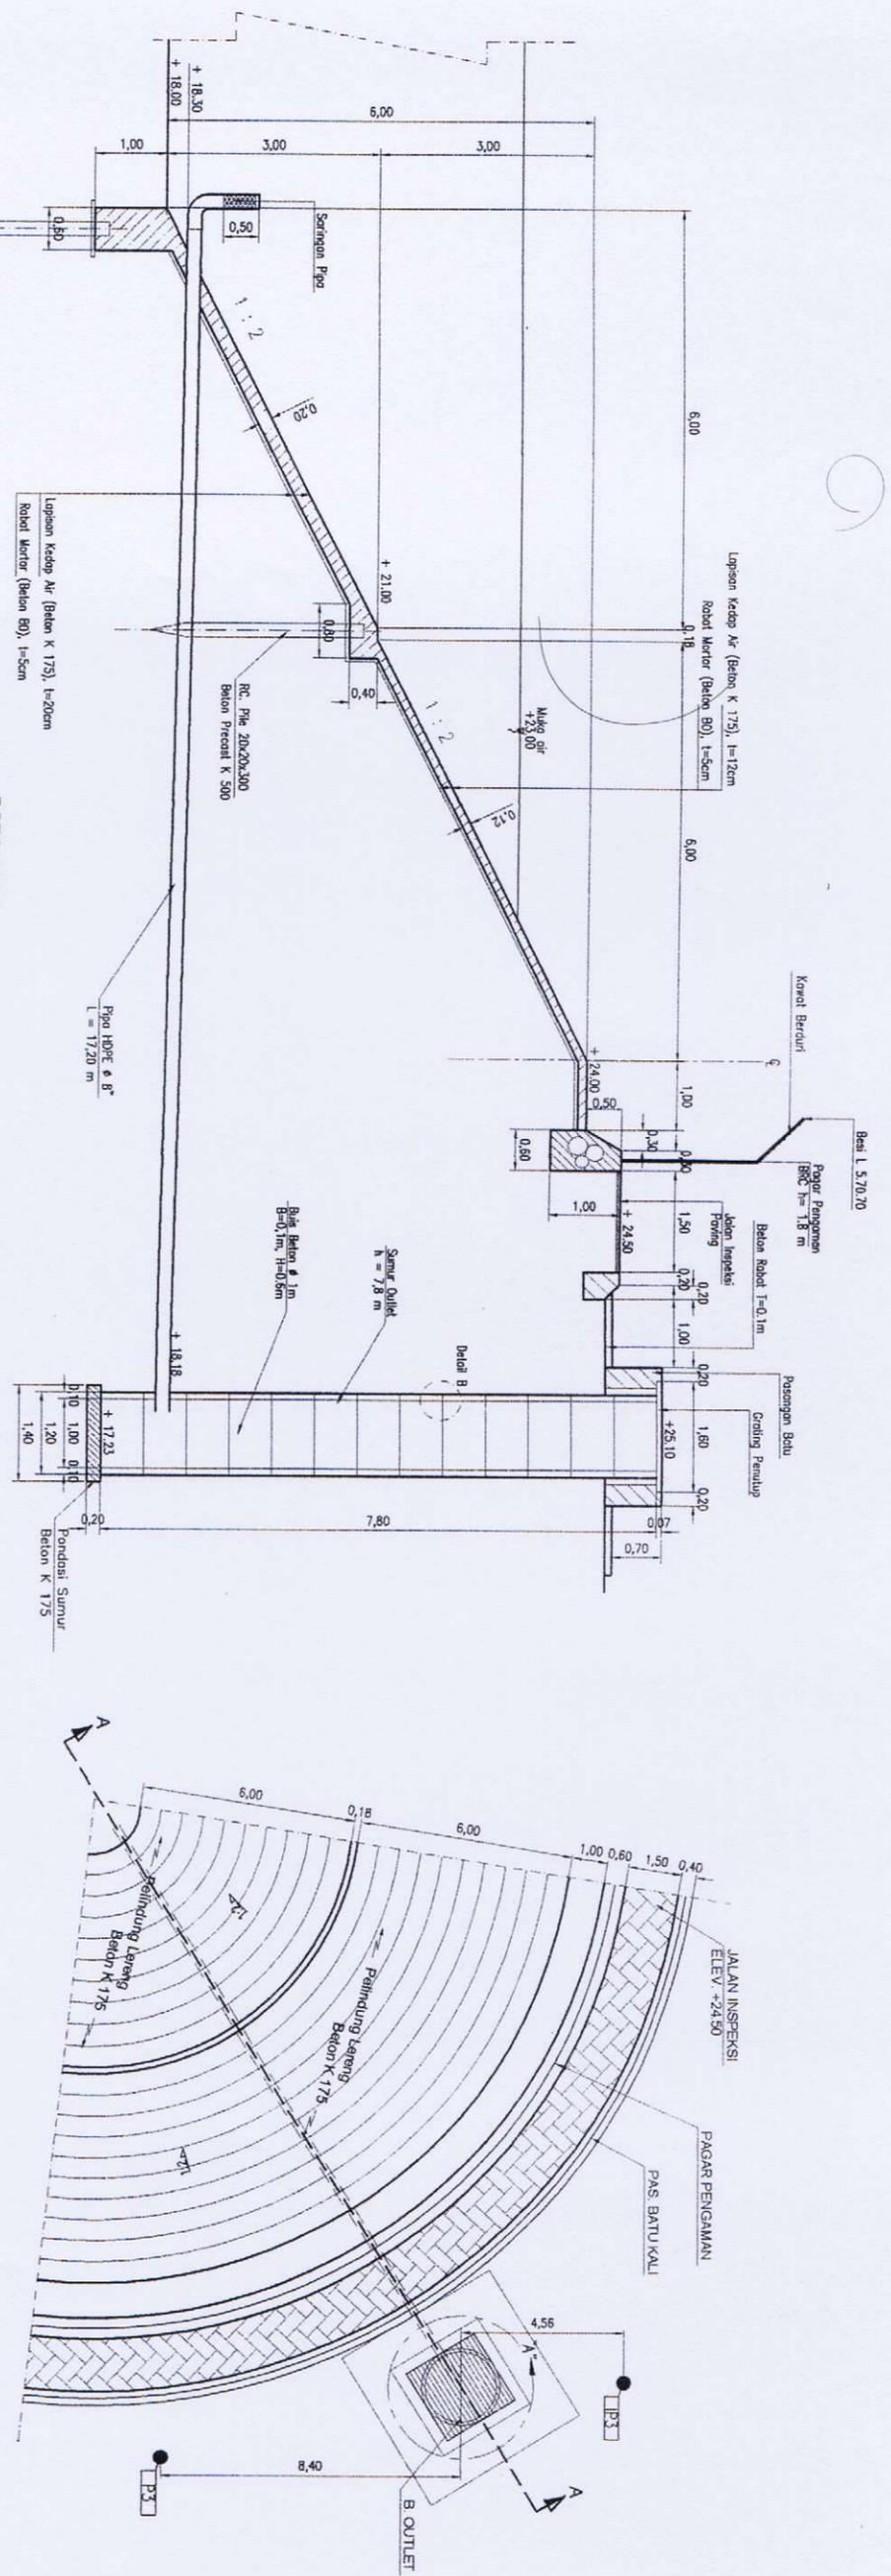

POTONGAN A-A  
SKALA C

DENAH OUTLET  
SKALA A

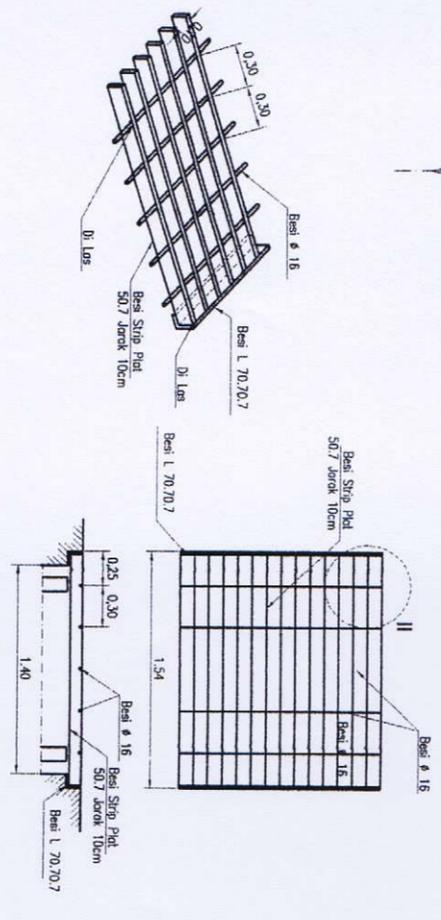


DETAIL PENUNGGAN GRATING  
(PENUTUP OUTLET)  
SKALA D


DETAIL "B"  
SKALA B

DETAIL PONDASI SUMURAN  
SKALA B


DETAIL "A"  
SKALA C




<p>PEREMPTAH PROVINSI JAWA TENGAH SUMBER DAYA AIR DAN PENYAIRAN RUANG GABBAR: EMBUNG JERUKKALING DETAIL STRUKTUR OUTLET</p>		<p>SIKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DOKUMEN DAN PENYAIRAN RUANG DOKUMEN DAN PENYAIRAN RUANG DOKUMEN DAN PENYAIRAN RUANG</p>	
<p>CV. SEKABADA DIKASIH Jl. Sekeloa No. 10 Kediri 65132</p>		<p>CV. SEKABADA DIKASIH Jl. Sekeloa No. 10 Kediri 65132</p>	
<p>Direksi/Kasab: Ir. Surodono, MT Kasab PPP: Ir. Laksono, Sp.1</p>		<p>Direksi/Kasab: Ir. Surodono, MT Kasab PPP: Ir. Laksono, Sp.1</p>	
<p>Yang Diarahi</p>		<p>Yang Diarahi</p>	
<p>Objek: Dikek</p>		<p>Objek: Dikek</p>	
<p>Disejuti</p>		<p>Disejuti</p>	
<p>No. Revisi</p>		<p>No. Revisi</p>	
<p>20 Mei 2018</p>		<p>20 Mei 2018</p>	

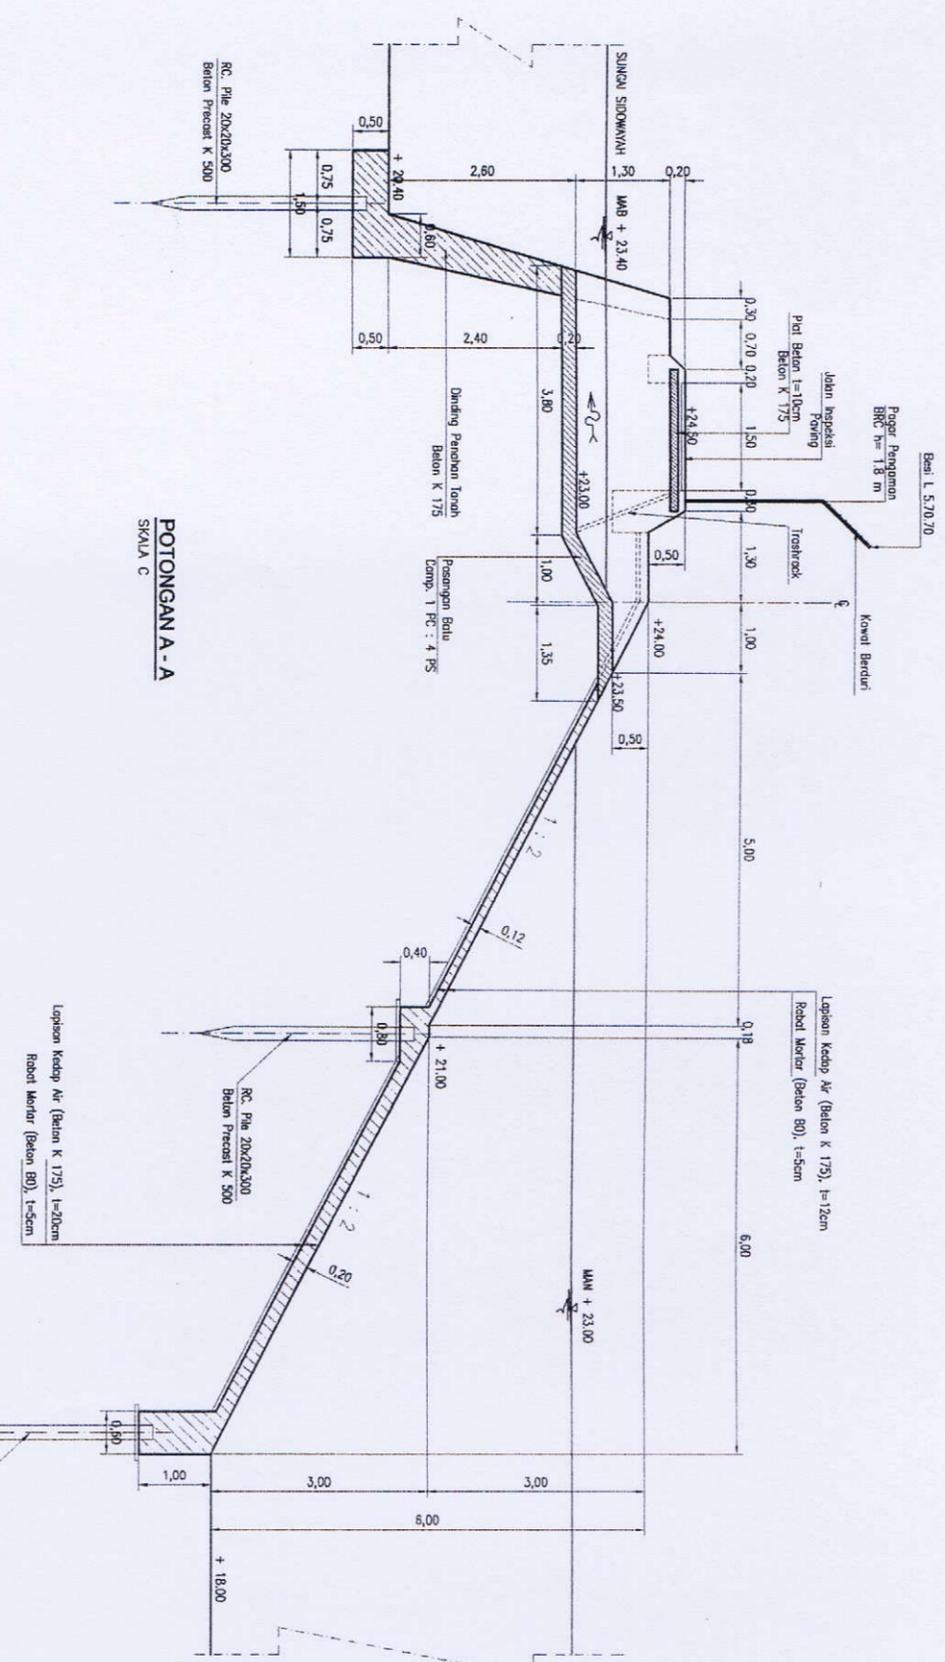


POTONGAN A - A  
SKALA C

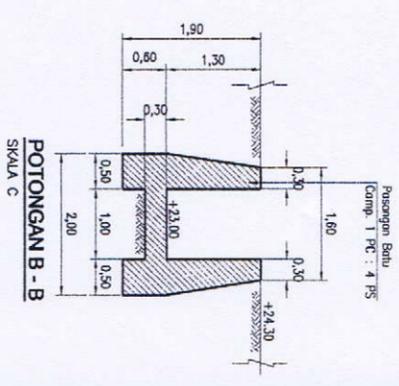


POTONGAN B - B  
SKALA C

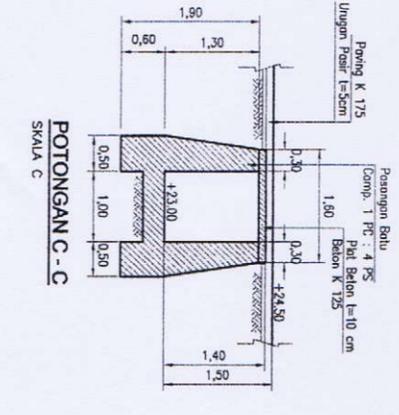


POTONGAN C - C  
SKALA C

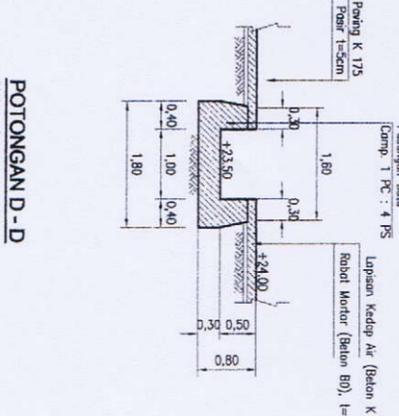


POTONGAN D - D  
SKALA C

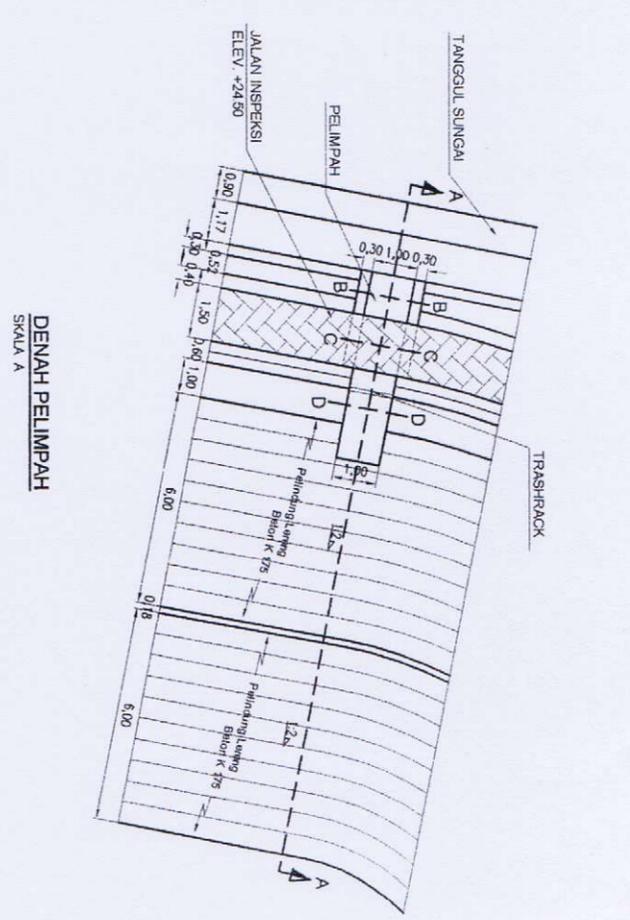

DENAH PELIMPAH  
SKALA A

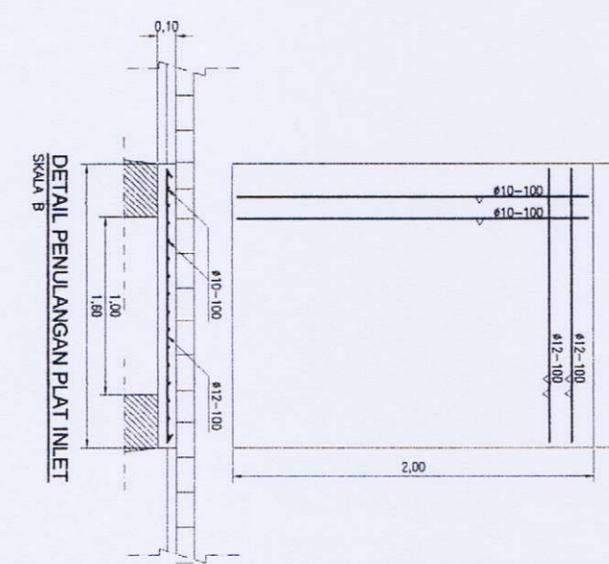

DETAIL PENUNGGAN PLAT INLET  
SKALA B










No. Rev	Tanggal	Yang Diperiksa	Oleh	Dikoreksi	Diaudit	Direvisi


**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**  
**DETAIL STRUKTUR PELIMPAH**

GABUNGAN PERUSAHAAN SURABAYA  
 PT. SIKAPATI BIKAS  
 Jl. Tugu Pahlawan No. 100, Surabaya, Jawa Timur  
 Telp. (031) 8473100, Fax. (031) 8473101  
 Email: info@gsa.co.id

No. Registrasi : 0117991  
 Tanggal : 20 Mei 2018

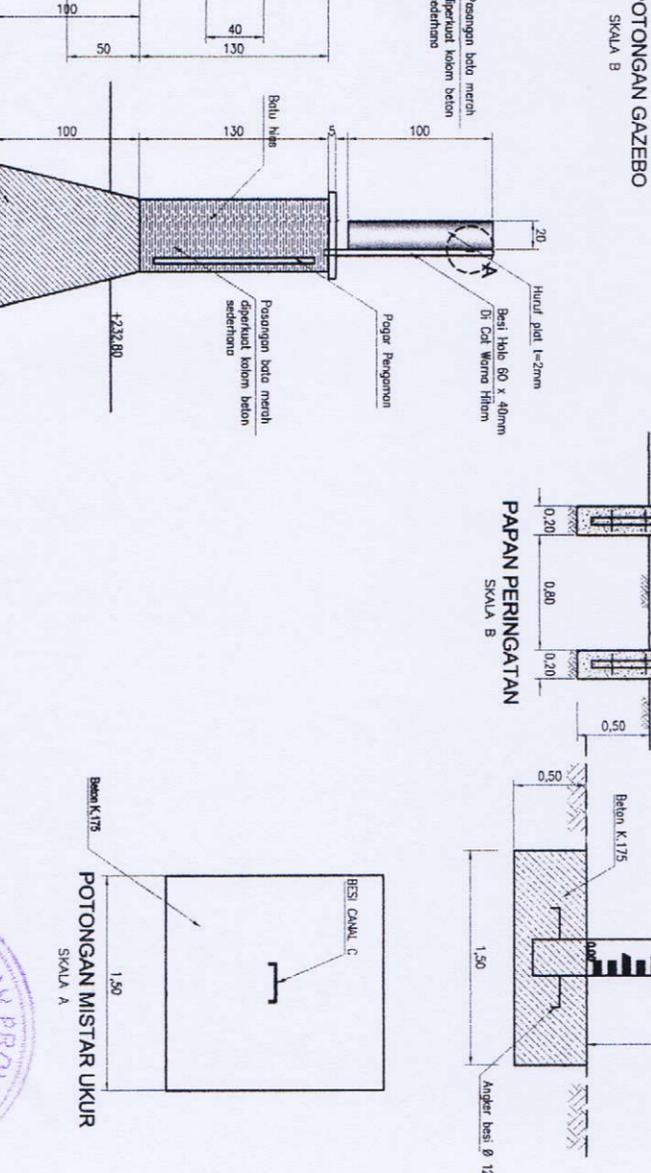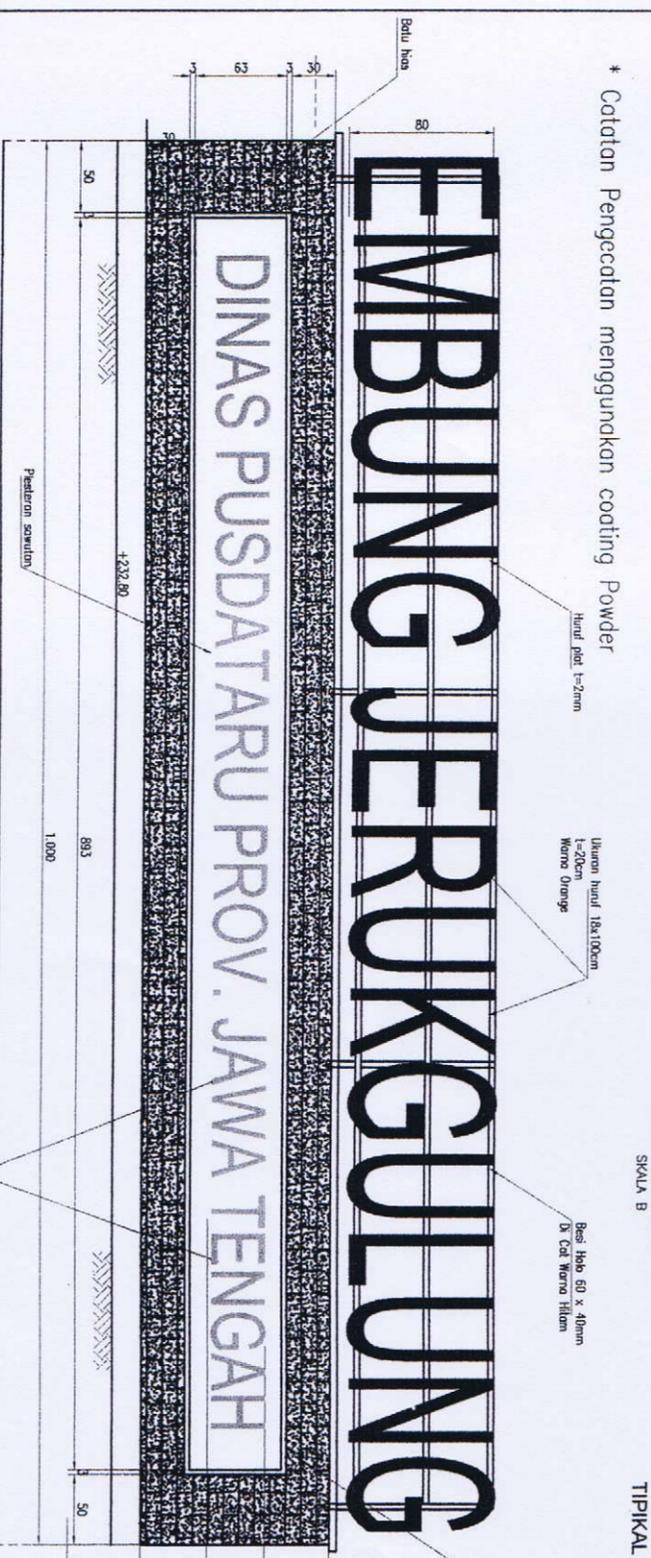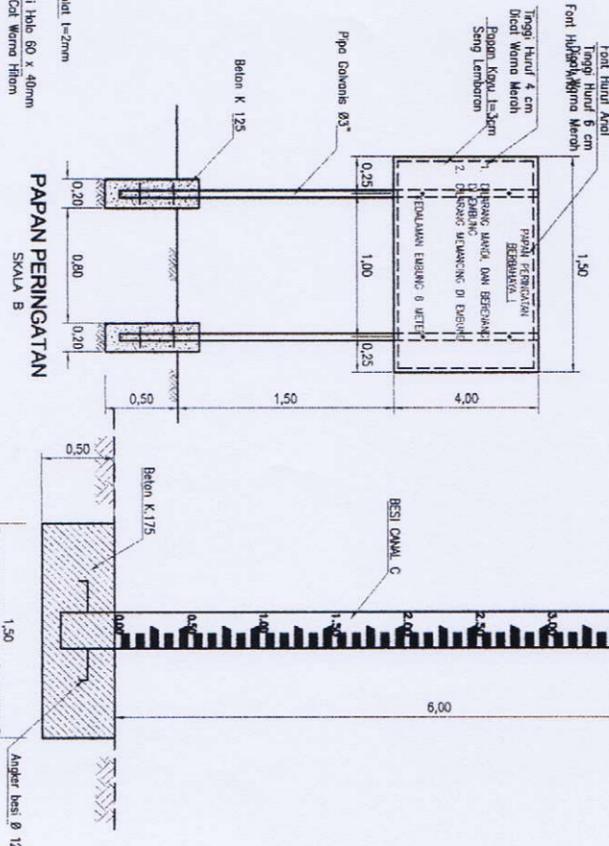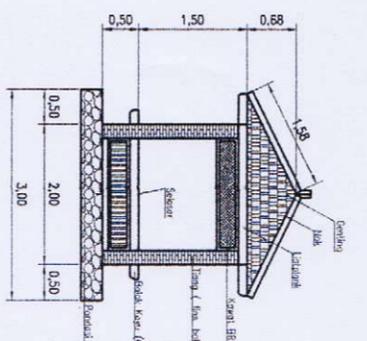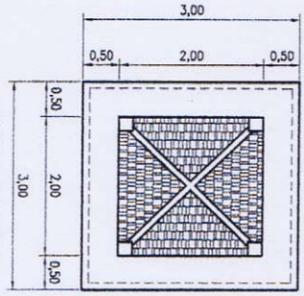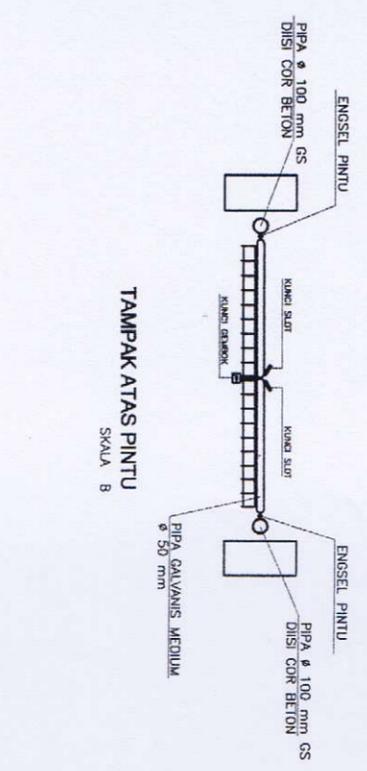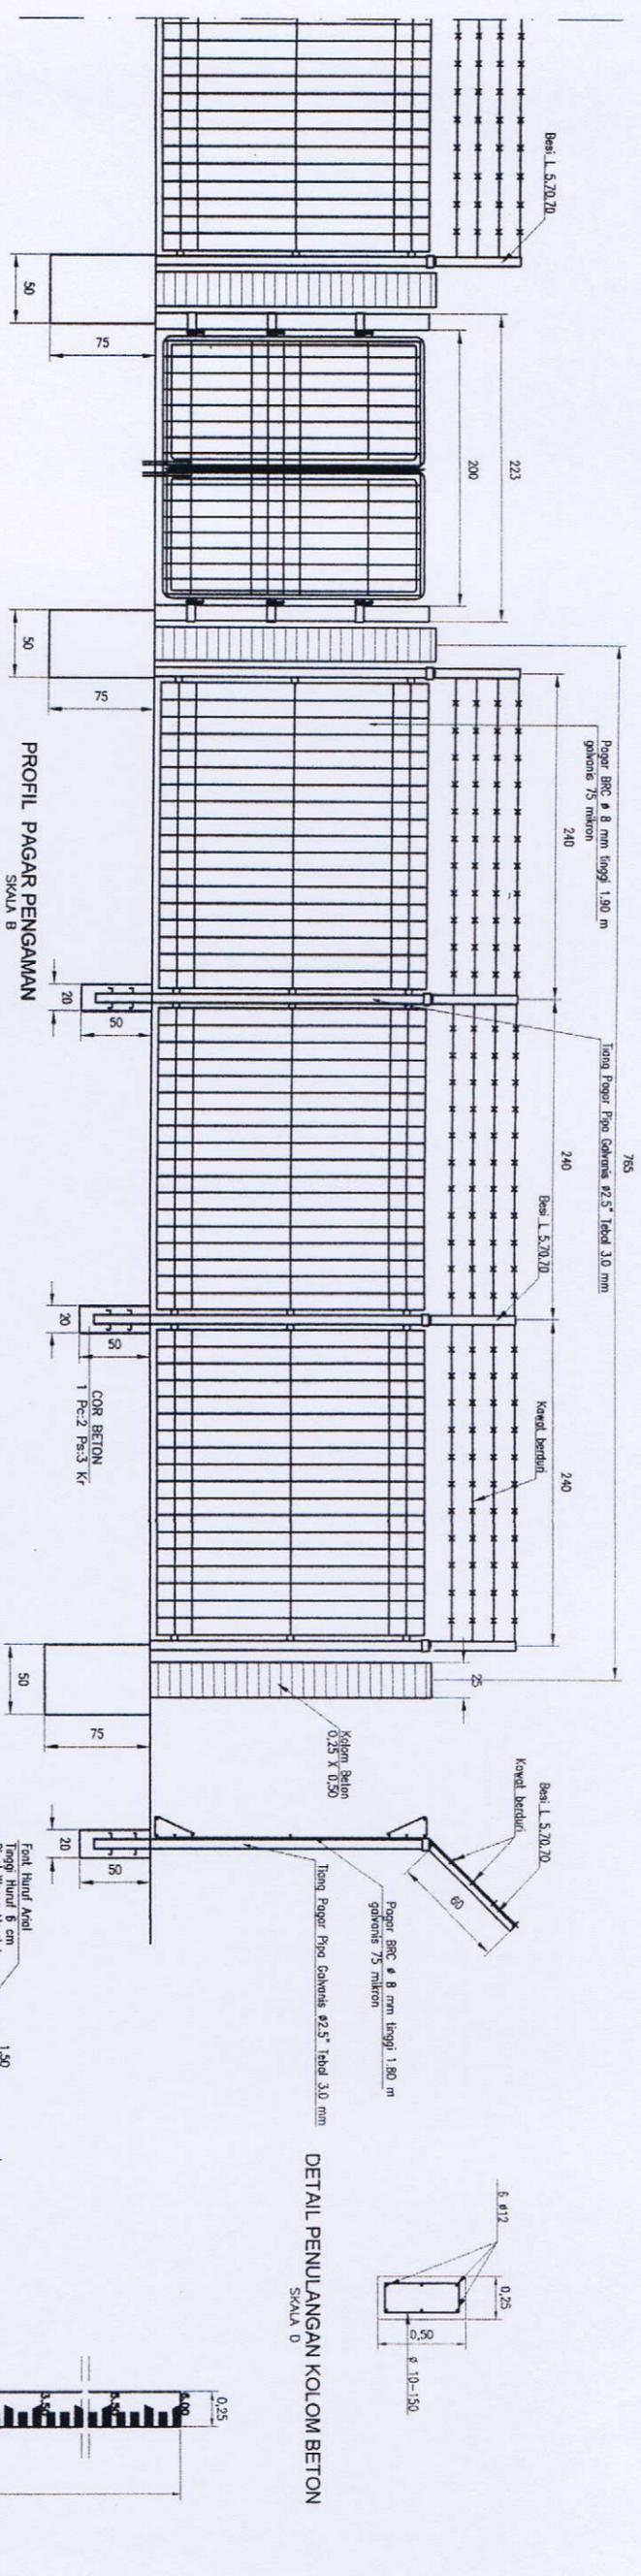

PROFIL TUGU NAMA EMBUUNG  
SKALA A



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PUSDATARU  
DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN  
DINAS PERTANAHAN DAN PERUMAHAN  
DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN  
DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN

SUMBER : DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN

GAMBAR : EMBUUNG JERUKGULUNG  
DETAIL UTILITAS DAN FASILITAS

CV SARABADA DISAIN  
Desain : Ir. Sarabada  
Dibuat oleh : Ir. Sarabada, MT  
Kantor PPT : Ir. Tuhito, Sp.1

Disetujui :  
Kantor PPT : Ir. Tuhito, Sp.1

20 Juli 2018

\* Catatan Pengecatan menggunakan coating Powder

Ukuran huruf 18x100cm  
Huruf plat t=2mm  
Ukuran huruf 18x100cm  
Huruf plat t=2mm  
Ukuran huruf 18x100cm  
Huruf plat t=2mm

Pasangan batu merah  
diperkuat kolom beton  
sederhana

## Persyaratan Kualifikasi Peserta

**Identitas Peserta**

Nama cv.simpatik karya mandiri  
 NPWP 02.518.119.9-506.000  
 Alamat jl.sentot prawirodirjo no.88 getas pajaten jati kudus  
 Telp -  
 Fax 0291-4251689  
 Email simpatikkmcv@gmail.com

**Pemilik**

<b>Nama Pemilik</b>	<b>Nomor KTP</b>	<b>Alamat</b>	<b>Saham</b>
MUTTAQIN HUSODO	3319070907680010	Getaspejaten Rt. 01 Rw.03 Kec. Jati Kudus	80.0 %
NOVRIAN WAHYU W.	3319020912130001	Mlati Kidul Rt. 05 Rw.01 Kec. Kota Kudus	20.0 %

**Pengurus**

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanggal Mulai Menjabat</b>	<b>Tanggal Akhir Menjabat</b>
NOVRIAN WAHYU W.	Mlati Kidul Rt. 05 Rw.01 Kec. Kota Kudus	KOMANDITER	10 Oktober 2006	Sekarang
MUTTAQIN HUSODO	Getaspejaten Rt. 01 Rw.03 Kec. Jati Kudus	DIREKTUR	10 Oktober 2006	Sekarang

**Izin Usaha**

<b>Izin Usaha</b>	<b>Nomor Surat</b>	<b>Berlaku Sampai</b>	<b>Instansi Pemberi</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Klasifikasi</b>
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	8120005932716	31 Januari 9999	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	Perusahaan Kecil	F42911 - KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR F42112 - KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG BG - Bangunan Gedung F42212 - KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE F42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA
Izin Usaha Jasa	8120005932716	31 Januari 9999	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	Perusahaan Kecil	F41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN F41014 -

Konstruksi  
(IUJK)

Nomor  
Induk  
Berusaha  
(NIB)

8120005932716

31 Januari  
9999PEMERINTAH  
REPUBLIK  
INDONESIAPerusahaan  
Kecil

Surat Izin  
Usaha  
Perdagangan  
(SIUP)

510/541/11.25/PK/25.03/2013

31 Januari  
9999KANTOR  
PELAYANAN  
PERIZINAN  
TERPADU  
KAB. KUDUSPerusahaan  
Kecil

KONSTRUKSI GEDUNG  
PERBELANJAAN|F41019  
- KONSTRUKSI  
GEDUNG LAINNYA|SI -  
Bangunan Sipil|F41011 -  
KONSTRUKSI GEDUNG  
TEMPAT TINGGAL  
F41019 - KONSTRUKSI  
GEDUNG  
LAINNYA|F42911 -  
KONSTRUKSI  
BANGUNAN  
PRASARANA SUMBER  
DAYA AIR|F41014 -  
KONSTRUKSI GEDUNG  
PERBELANJAAN|F42112  
- KONSTRUKSI  
JEMBATAN DAN JALAN  
LAYANG|F42111 -  
KONSTRUKSI JALAN  
RAYA|F41015 -  
KONSTRUKSI GEDUNG  
KESEHATAN|F42212 -  
KONSTRUKSI  
BANGUNAN  
PENGOLAHAN,  
PENYALURAN DAN  
PENAMPUNGAN AIR  
MINUM, AIR LIMBAH  
DAN DRAINASE|F41011  
- KONSTRUKSI  
GEDUNG TEMPAT  
TINGGAL  
I56210 - JASA BOGA  
UNTUK SUATU EVENT  
TERTENTU (EVENT  
CATERING)|G46499 -  
PERDAGANGAN  
BESAR BERBAGAI  
BARANG DAN  
PERLENGKAPAN  
RUMAH TANGGA  
LAINNYA YTDL|N78200  
- JASA PENYEDIAAN  
TENAGA KERJA  
WAKTU  
TERTENTU|N81210 -  
JASA KEBERSIHAN  
UMUM  
BANGUNAN|H52214 -  
JASA PERPARKIRAN DI  
BADAN JALAN (ON  
STREET  
PARKING)|G45401 -  
PERDAGANGAN  
BESAR SEPEDA  
MOTOR BARU|G46638 -  
PERDAGANGAN  
BESAR BERBAGAI

MACAM MATERIAL  
BANGUNAN|G46692 -  
PERDAGANGAN  
BESAR PUPUK DAN  
PRODUK  
AGROKIMIA|G46491 -  
PERDAGANGAN  
BESAR PERALATAN  
DAN PERLENGKAPAN  
RUMAH  
TANGGA|G46530 -  
PERDAGANGAN  
BESAR MESIN,  
PERALATAN DAN  
PERLENGKAPAN  
PERTANIAN|G46599 -  
PERDAGANGAN  
BESAR MESIN,  
PERALATAN DAN  
PERLENGKAPAN  
LAINNYA|G46412 -  
PERDAGANGAN  
BESAR  
PAKAIAN|G46521 -  
PERDAGANGAN  
BESAR  
PERLENGKAPAN  
ELEKTRONIK|G45406 -  
PERDAGANGAN  
ECERAN SUKU  
CADANG SEPEDA  
MOTOR DAN  
AKSESORINYA|G46494 -  
PERDAGANGAN  
BESAR  
KOSMETIK|G46693 -  
PERDAGANGAN  
BESAR ALAT  
LABORATORIUM,  
FARMASI DAN  
KEDOKTERAN|G46512 -  
PERDAGANGAN  
BESAR PIRANTI  
LUNAK|G46511 -  
PERDAGANGAN  
BESAR KOMPUTER  
DAN PERLENGKAPAN  
KOMPUTER|G46422 -  
PERDAGANGAN  
BESAR BARANG  
PERCETAKAN DAN  
PENERBITAN DALAM  
BERBAGAI  
BENTUK|G45103 -  
PERDAGANGAN  
ECERAN MOBIL  
BARU|G45302 -  
PERDAGANGAN  
ECERAN SUKU

CADANG DAN  
AKSESORI MOBIL

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	11.253.42.00943	08 November 2021	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS	Perusahaan Kecil	
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	0.3319.06.023.1.11.11944	25 April 2020	LPJK	Perusahaan Kecil	BG004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial BG008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan BG009 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya BG004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial BG009 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya BG001 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel BG008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan BG001 - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	0.3319.07.023.1.11.11944	25 April 2020	LPJK	Perusahaan Kecil	SI002 - Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. SI002 - Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. SI001 - Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya SI001 - Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya SI003 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu

Bandara|SI003 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara|SI004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways|SI004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways

## Bukti Pajak

Pajak	Tanggal	No. Bukti
SPT Tahunan - 0 Tahun 2018	08 April 2019	32199406405192008821

## Akta

### Akta Pendirian

**Nomor** 17  
**Tanggal Surat** 10 Oktober 2006  
**Notaris** DJOKO SANJOTO, S.H.

### Akta Perubahan Terakhir

**Nomor** 19  
**Tanggal Surat** 09 Januari 2017  
**Notaris** WIWIK ALAWIYAH, SH

## Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
<a href="#">ABDUL ROUF, ST</a>	14 April 1980	S1 Teknik Sipil	5 Tahun	Ahli Teknik Sumber Daya Air – Muda dan Ahli Manajemen Kontruksi – Muda
<a href="#">SUKISNO</a>	12 Juli 1980	S1 Teknik Sipil	2 Tahun	Ahli K3 Kontruksi - Muda
<a href="#">EDY SUTOPO</a>	08 September 1994	SMK Bangunan	5 Tahun	Pelaksana Pekerjaan Jaringan Irigasi
<a href="#">PRASTIYO</a>	21 Januari 1990	SMK Bangunan	3 Tahun	Pelaksana Bangunan Irigasi
<a href="#">ALI MUTAQIN</a>	28 September 1987	SMK Bangunan	2 Tahun	Juru Hitung Kuantitas
<a href="#">NUR ARIFIN</a>	27 Desember 1993	SMK Bangunan	3 Tahun	Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan
<a href="#">SUGENG HARIYADI</a>	18 Oktober 1974	SMA	2 Tahun	Logistik dan Administrasi
<a href="#">MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN</a>	20 Agustus 1994	SMK Bangunan	2 Tahun	Tukang Begisting(Acuan) dan Perancah Bidang Sumber Daya Air – Kelas 1

**Pengalaman**

Export to xlsx

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
<a href="#">Rehabilitasi D.I Jaranan (Bangub)</a>	Jawa Tengah	Dinas Bina Marga Pengairan Energi & Sumber Daya Air Kab. Kudus		22 Juli 2016	18 November 2016	Rp 980.481,00	602/Kontrak/PPK/24.10-01/SDA/2016

**Pekerjaan Sedang Berjalan**

Export to xlsx

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
<a href="#">Rehabilitasi Jbt. Pandak Ruas Kudus - Colo (208)</a>	Jawa Tengah	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	Jl. Panglima Sudirman No. 2	02 Juli 2019	13 Januari 2020	Rp 999.973.000,00	027.2/1007

**Peralatan**

Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
<a href="#">Alat Ukur Optik</a>	1	-	-	2016	Baik	Kab. Kudus	Milik Sendiri	Milik Sendiri/Pembelian Berkwitansi
<a href="#">Stamper</a>	1	>1.50 HP	Mikasa	2016	Baik	Kab. Kudus	Milik Sendiri	Milik Sendiri/Pembelian Berkwitansi
<a href="#">Pompa</a>	2	6,5 HP	Starke	2017	Baik	Kab. Kudus	Milik Sendiri	Milik Sendiri/Pembelian Berkwitansi
<a href="#">Excavator</a>	1	0,8 m3	Komatsu	2016	Baik	Kab. Kudus	Sewa	Perjanjian Sewa Alat
<a href="#">Concrete Vibrator</a>	2	>5.0 HP	Mikasa, Honda	2016	Baik	Kab. Kudus	Milik Sendiri	Milik Sendiri/Pembelian Berkwitansi
<a href="#">Dump Truck</a>	3	5 m3	Mitsubishi	2012	Baik	Kab. Kudus	Sewa	Perjanjian Sewa Alat
<a href="#">Concrete Mixer</a>	5	0,3 m3	Azada, Tiger	2016	Baik	Kab. Kudus	Milik Sendiri	Milik Sendiri/Pembelian Berkwitansi

**Persyaratan Kualifikasi Lainnya**

- [3.g\\_Spesifikasi Teknik.pdf](#) - 413 KB
- [3.g\\_Pny memenuhi spektek.pdf](#) - 3 MB
- [0. Company Profil.pdf](#) - 10 MB

Total Pengunjung: 5.232.517

27 September 2019 17:08 WIB

© 2006-2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([LKPP](#))





Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



- [BERANDA](#)
- [DAFTAR PAKET](#)
- [LOG AKSES](#)
- [GANTI PASSWORD](#)
  
- [LOGOUT](#)

Ir. SR. Eko Yuniarto, Sp.1 - Pejabat Pembuat Komitmen  
[Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Procurement Lainnya](#)

1. [Beranda](#)
2. [Daftar Paket](#)
3. [Edit Paket](#)
4. Rincian HPS

**TOTAL PAGU : Rp 2.400.000.000,00**

	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga	Pajak (%)	Total	Keterangan
1	MATA PEMBAYARAN UMUM (MPU)		1,00	0,00	10,00	0,00	
2	PEKERJAAN PERSIAPAN		1,00	0,00	10,00	0,00	
3	Kistdam & pengeringan	Ls	1,00	2.102.111,33	10,00	2.312.322,46	
4	Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1,00	5.500.000,00	10,00	6.050.000,00	
5	Rencana Keselamatan Kerja	Ls	1,00	8.650.000,00	10,00	9.515.000,00	
6	MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA (MPPU)		1,00	0,00	10,00	0,00	
7							
8	PEKERJAAN KONSTRUKSI		1,00	0,00	10,00	0,00	
9							
10	Galian tanah biasa manual	m3	158,50	45.828,20	10,00	7.990.146,67	
11	Galian tanah dg. alat berat	m3	8.007,00	13.982,41	10,00	123.152.872,56	
12	Timbunan tanah dipadatkan	m3	494,19	51.425,00	10,00	27.955.092,82	
13	Hauling jarak 100 m	m3	1.513,10	15.376,29	10,00	25.593.803,95	
14	Hauling jarak 500 m	m3	5.912,60	16.645,14	10,00	108.257.660,24	
15	Pasangan batu kali 14	m3	269,78	1.103.850,00	10,00	327.576.318,30	
16	Plesteran 1 3	m2	382,31	62.723,32	10,00	26.377.727,72	
17	Siaran 1 2	m2	166,78	58.473,80	10,00	10.727.486,40	
18	Beton B.0 untuk lantai kerja	m3	105,68	912.076,00	10,00	106.027.010,88	
19	Beton K.175	m3	431,19	1.091.588,49	10,00	517.750.245,10	
20	Pembesian	kg	11.007,00	14.328,60	10,00	173.501.678,84	
21	Bekisting	m2	362,72	64.097,00	10,00	25.574.190,22	
22	Wiremesh 8 mm	kg	16.454,00	17.402,00	10,00	314.967.290,18	
23	Pemasangan pipa HDPE 8	m	17,20	374.951,50	10,00	7.094.082,38	
24	Grill Penutup / Gratting	m2	139,54	554.464,71	10,00	85.107.006,20	
25	Waterstop PVC lebar 230 - 320 mm	m	162,00	103.268,00	10,00	18.402.357,60	
26							
27	Buis beton 100 cm	m	13,00	448.492,00	10,00	6.413.435,60	
28	Minipile 20x20x300	m	492,80	227.733,00	10,00	123.449.504,64	
	Set saringan pipa 8	bh	1,00	150.000,00	10,00	165.000,00	
29	Paving block tebal 6 cm	m2	295,31	185.588,70	10,00	60.286.818,90	

	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga	Pajak (%)	Total	Keterangan
30	Pagar BRC tinggi 1.75 m 7 mm (hot dip)	lbr	79,00	994.895,00	10,00	86.456.375,50	
31	Tiang pagar dari pipa galvanis 2 (lengkap dg dop)	m	240,75	158.829,00	10,00	42.061.889,92	
32	Pengadaan & pemasangan	m2	3,60	857.395,00	10,00	3.395.284,20	
33	pintu pagar BRC double swing						
34	Besi profil (	kg	304,65	75.168,50	10,00	25.190.091,88	
35	dudukan/penyangga kawat berduri )						
32	Kawat berduri	m	765,89	14.432,00	10,00	12.158.656,93	
33	Papan nama embung dari galvalum @huruf besar	huruf	17,00	863.863,00	10,00	16.154.238,10	
34	Papan nama embung dari galvalum @huruf kecil	huruf	82,00	200.167,00	10,00	18.055.063,40	
35	Logo Jawa Tengah	bh	1,00	350.000,00	10,00	385.000,00	

**TOTAL NILAI Rp. 2.399.988.889,06**

[Kembali](#)

- [Tentang Kami](#)
- [Pakta Integritas](#)
- [Persyaratan dan Ketentuan](#)

Total Pengunjung: 5.232.517

27 September 2019 17:08 WIB

© 2006-2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([LKPP](#))

SPSE v4.3u20190828-CA

## Rincian Penawaran Peserta cv.simpatik karya mandiri

<b>Kode Tender</b>	15171042
<b>Nama Paket</b>	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Jeruk Gulung Kab. Demak
<b>Nama Peserta</b>	cv.simpatik karya mandiri
<b>Tanggal Kirim</b>	25 Juli 2019 10:20

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
MATA PEMBAYARAN UMUM (MPU)		1.0	Rp 0,00	Rp 0,00	10.0	Rp 0,00	
PEKERJAAN PERSIAPAN		1.0	Rp 0,00	Rp 0,00	10.0	Rp 0,00	
Kistdam & pengeringan	Ls	1.0	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	10.0	Rp 2.200.000,00	
Mobilisasi & Demobilisasi	Ls	1.0	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	10.0	Rp 4.950.000,00	
Rencana Keselamatan Kerja	Ls	1.0	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	10.0	Rp 1.980.000,00	
MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA (MPPU)		1.0	Rp 0,00	Rp 0,00	10.0	Rp 0,00	
PEKERJAAN KONSTRUKSI		1.0	Rp 0,00	Rp 0,00	10.0	Rp 0,00	
Galian tanah biasa manual	m3	158.5	Rp 44.277,14	Rp 7.017.926,69	10.0	Rp 7.719.719,36	
Galian tanah dg. alat berat	m3	8007.0	Rp 11.368,70	Rp 91.029.180,90	10.0	Rp 100.132.098,99	
Timbunan tanah dipadatkan	m3	494.19	Rp 42.532,50	Rp 21.019.136,18	10.0	Rp 23.121.049,79	
Hauling jarak 100 m	m3	1513.18	Rp 13.874,20	Rp 20.994.161,96	10.0	Rp 23.093.578,15	
Hauling jarak 500 m	m3	5912.6	Rp 14.982,30	Rp 88.584.346,98	10.0	Rp 97.442.781,68	
Pasangan batu kali 14	m3	269.78	Rp 871.771,80	Rp 235.186.596,20	10.0	Rp 258.705.255,82	
Plesteran 1 3	m2	382.31	Rp 55.431,09	Rp 21.191.860,02	10.0	Rp 23.311.046,02	
Siaran 1 2	m2	166.78	Rp 53.621,34	Rp 8.942.967,09	10.0	Rp 9.837.263,79	
Beton B.0 untuk lantai kerja	m3	105.68	Rp 796.041,48	Rp 84.125.663,61	10.0	Rp 92.538.229,97	
Beton K.175	m3	431.19	Rp 970.608,28	Rp 418.516.584,25	10.0	Rp 460.368.242,68	
Pembesian	kg	11007.97	Rp 11.301,23	Rp 124.403.600,80	10.0	Rp 136.843.960,88	
Bekisting	m2	362.72	Rp	Rp	10.0	Rp	

			52.931,30	19.199.241,14		21.119.165,25
Wiremesh 8 mm	kg	16454.08	Rp 13.596,22	Rp 223.713.291,58	10.0	Rp 246.084.620,74
Pemasangan pipa HDPE 8	m	17.2	Rp 364.126,35	Rp 6.262.973,22	10.0	Rp 6.889.270,54
Grill Penutup / Gratting	m2	139.54	Rp 443.194,43	Rp 61.843.350,76	10.0	Rp 68.027.685,84
Waterstop PVC lebar 230 - 320 mm	m	162.0	Rp 95.399,06	Rp 15.454.647,72	10.0	Rp 17.000.112,49
Buis beton 100 cm	m	13.0	Rp 423.574,80	Rp 5.506.472,40	10.0	Rp 6.057.119,64
Minipile 20x20x300	m	492.8	Rp 192.728,40	Rp 94.976.555,52	10.0	Rp 104.474.211,07
Set saringan pipa 8	bh	1.0	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00	10.0	Rp 137.500,00
Paving block tebal 6 cm	m2	295.31	Rp 161.321,76	Rp 47.639.928,95	10.0	Rp 52.403.921,84
Pagar BRC tinggi 1.75 m 7 mm (hot dip)	lbr	79.0	Rp 824.927,20	Rp 65.169.248,80	10.0	Rp 71.686.173,68
Tiang pagar dari pipa galvanis 2 (lengkap dg dop)	m	240.75	Rp 126.710,47	Rp 30.505.545,65	10.0	Rp 33.556.100,22
Pengadaan & pemasangan pintu pagar BRC double swing	m2	3.6	Rp 831.711,00	Rp 2.994.159,60	10.0	Rp 3.293.575,56
Besi profil (dudukan/penyangga kawat berduri )	kg	304.65	Rp 40.309,04	Rp 12.280.149,04	10.0	Rp 13.508.163,94
Kawat berduri	m	765.89	Rp 13.289,40	Rp 10.178.218,57	10.0	Rp 11.196.040,42
Papan nama embung dari galvalum @huruf besar	huruf	17.0	Rp 773.316,82	Rp 13.146.385,94	10.0	Rp 14.461.024,53
Papan nama embung dari galvalum @huruf kecil	huruf	82.0	Rp 191.990,10	Rp 15.743.188,20	10.0	Rp 17.317.507,02
Logo Jawa Tengah	bh	1.0	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	10.0	Rp 330.000,00
Pasangan dinding batu tempel hitam	m2	27.3	Rp 213.224,25	Rp 5.821.022,03	10.0	Rp 6.403.124,23
Pasangan batu bata 15	m2	13.0	Rp 166.483,44	Rp 2.164.284,72	10.0	Rp 2.380.713,19
Gazebo	unit	3.0	Rp 9.500.000,00	Rp 28.500.000,00	10.0	Rp 31.350.000,00
Papan peringatan	bh	1.0	Rp 1.900.000,00	Rp 1.900.000,00	10.0	Rp 2.090.000,00
Peilschal	m	6.0	Rp 475.000,00	Rp 2.850.000,00	10.0	Rp 3.135.000,00
Pengadaan dan	bh	1.0	Rp	Rp	10.0	Rp 9.900.000,00

pemasangan pintu  
angkat baja b =  
0,60 h = 0,90 m

9.000.000,00 9.000.000,00

**Total Penawaran**

**Rp  
1.985.044.257,34**

Total Pengunjung: 5.232.517

27 September 2019 17:09 WIB

© 2006-2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([LKPP](#))

SPSE v4.3u20190828-CA

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK
- 1.3. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran
- 1.4. Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
- 1.5. Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
- 1.6. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
- 1.7. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu
- 1.8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
- 1.9. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
- 1.10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi

- 1.11. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis
- 1.12. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi
- 1.13. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan
- 1.14. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 1.15. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 1.16. Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
- 1.17. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 1.18. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar
- 1.19. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis
- 1.20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim

yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa

- 1.21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah
- 1.22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
- 1.23. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
- 1.24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
- 1.25. Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan
- 1.26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah
- 1.27. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak
- 1.28. Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan
- 1.29. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu
- 1.30. Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak)
- 1.31. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi / lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan

- Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- 1.32. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan
  - 1.33. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan
  - 1.34. Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK
  - 1.35. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK
  - 1.36. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian
  3. Bahasa dan Hukum
    - 3.1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia
    - 3.2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia
    - 3.3. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia
  4. Korespondensi
    - 4.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK
    - 4.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK
  5. Wakil Sah Para Pihak
    - 5.1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK

atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK

- 5.2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak
  - 5.3. Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas :
    - a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
    - b. mengelola administrasi kontrak; dan
    - c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
- 6.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
    - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
    - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
    - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini
  - 6.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas
  - 6.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
    - a. pemutusan Kontrak;
    - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
    - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
    - c. penenaan Sanksi Daftar Hitam.  
[catatan: penenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
      - 1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar
      - 2) Hitam; dan

- 3) unit kerja yang melaksanakan fungsi
- 4) layanan pengadaan secara elektronik,
- 5) untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- 6.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA
- 6.5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7. Asal Material/Bahan
  - 7.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor
  - 7.2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi
- 8. Pembukuan  
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
- 9. Perpajakan  
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak
  - 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya
  - 10.2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
- 11. Pengabaian  
Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian
- 12. Penyedia Mandiri  
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka
- 13. KSO  
KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

- terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
    - 14.1. PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas)
    - 14.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK
  15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
    - 15.1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan
    - 15.2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.  
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak
    - 15.3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
      - a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
      - b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
      - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
      - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
      - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
      - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
      - a. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

- 15.4. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini
16. Penemuan-penemuan      Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara
17. Akses ke Lokasi Kerja
- 17.1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan
- 17.2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka :
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
  - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
  - c. Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
  - d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses
- 17.3. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut

## **B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

18. Masa Pelaksanaan Kontrak      Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi

### **B.1. Pelaksanaan Pekerjaan**

19. Penyerahan Lokasi Kerja
- 19.1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak
- 19.2. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang

tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan

- 19.3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja
- 19.4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak
- 19.5. Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 20.1. PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali
- 20.2. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

- 21.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK
- 21.2. RMPK disusun paling sedikit berisi:
  - a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement );
  - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / Inspection and Test Plan (ITP);
  - c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok
- 21.3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini
- 21.4. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan
- 21.5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Addendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi
- 21.6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,

- termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK
- 21.7. Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 22.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK
- 22.2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak
- 22.3. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak
- 22.4. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK
- 22.5. Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 23.1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
- 23.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. RMPK;
  - b. pelaksanaan RKK;
  - b. organisasi kerja;
  - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
  - f. penyusunan rencana pengukuran / pemeriksaan bersama; dan
  - g. hal-hal lain yang dianggap perlu
- 23.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24. Mobilisasi
- 24.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja
- 24.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
  - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi
- 24.3. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
- 25.1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%)
- 25.2. Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
- 25.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak
- 25.4. Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi
- 25.5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran
- 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat

- Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
- b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor
- 26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

## **B.2. Pengendalian Waktu**

27. Masa Pelaksanaan
- 27.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK
- 27.2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak
- 27.3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda
- 27.4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK
- 27.5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK
29. Rapat Pemantauan
- 29.1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan

untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini

29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat

29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat

### 30. Peringatan Dini

30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia

30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut

### B.3. Penyelesaian Kontrak

#### 31. Serah Terima Pekerjaan

31.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan

31.2. PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan

31.3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak

31.4. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan

31.5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

- 31.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak
- 31.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan
- 31.8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK
- 31.9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan
- 31.10. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
- 31.11. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan
- 31.12. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4
- 31.13. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA
- 31.14. PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan
- 31.15. PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen

program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan

31.16. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif

31.17. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara

31.18. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK

31.19. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu :

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan

31.20. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan

31.21. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK

31.22. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara

## 32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan

## 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan

33.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK

33.2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan

#### **B.4. Adendum**

34. Perubahan Kontrak
- 34.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak
  - 34.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
    - a. perubahan pekerjaan;
    - b. perubahan Harga Kontrak;
    - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
    - d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi
  - 34.3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
35. Perubahan Pekerjaan
- 35.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
    - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
    - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
    - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
    - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - 35.2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
    - a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
    - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
    - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - 35.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan hargadengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal
  - 35.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak
  - 35.5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir

- tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran
36. Perubahan Harga
- 36.1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
  - penyesuaian harga; dan/atau
  - Peristiwa Kompensasi
- 36.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi
- 36.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi
- 36.4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK
- 36.5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi
- 36.6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - penyesuaian harga diberlakukan pada
  - Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- f. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/addendum Kontrak;
  - g. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - h. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut ditandatangani;
  - i. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
  - j. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 36.7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK
- 36.8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
- 37.1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
    - a. perubahan pekerjaan;
    - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
    - c. Peristiwa Kompensasi.
  - 37.2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
    - a. perubahan pekerjaan;
    - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
    - b. Keadaan Kahar
  - 37.3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.
  - 37.4. PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan

atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan

- 37.5. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama
- 37.6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak
- 37.7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak

#### **B.5. Keadaan Kahar**

##### **38. Keadaan Kahar**

- 38.1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya
- 38.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak
- 38.3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut
- 38.4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
  - a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
  - b. Foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 38.5. PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti

sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.

- 38.6. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 38.7. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat :
  - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan / diselesaikannya pekerjaan
- 38.8. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan
- 38.9. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran
- 38.10. Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak
- 38.11. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit

## B.5. Keadaan Kahar

39. Keadaan Kahar Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38
40. Pemutusan Kontrak
- 40.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- 40.2. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- 40.3. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh PPK
- 41.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang
  - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
  - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
  - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 41.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 41.3. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 41.4. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
- 41.5. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan / pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 41.6. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat

42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia

- untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 44.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis :
- 44.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
  - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
  - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 44.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
  - b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara Acara SCM Tahap I.
  - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba

- kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
  - e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan
- 45.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
  - 45.2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
    - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
    - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
    - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
    - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
  - 45.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir
  - 45.4. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran
46. Peninggalan
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK

### C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban Penyedia Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
  - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
  - i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK
48. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
49. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia

50. Penanggungungan Risiko
- 50.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
  - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 50.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK
- 50.3. Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam pasal ini
- 50.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia
51. Perlindungan Tenaga Kerja
- 51.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 51.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut
- 51.3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi

- Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai
- 51.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian
52. Pemeliharaan Lingkungan  
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup
53. Asuransi  
53.1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga  
53.2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja  
53.3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak
54. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan  
54.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:  
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;  
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;  
c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;  
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK  
54.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:  
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;  
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

- c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

55. Laporan Hasil Pekerjaan

- 55.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
- 55.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
- 55.3. Laporan harian berisi:
  - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
  - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan
- 55.4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- 55.5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- 55.6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan
- 55.7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK

56. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia

paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK

57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia

- 57.1. Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil
- 57.2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut
- 57.3. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 57.4. Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain
- 57.5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK
- 57.6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam addendum Kontrak
- 57.7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK
- 57.8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut

58. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja

59. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah yang

disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

60. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia

61. Jaminan

61.1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima

61.2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

61.3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum;
- 2) Perusahaan Asuransi;
- 3) Perusahaan Penjaminan;
- 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
- 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)

b. paket pekerjaan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum; atau
- 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program

asuransi kerugian (suretyship).

- 61.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar :
  - a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; atau
  - b. 5% (lima perseratus) dari Nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 61.5. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)
- 61.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak
- 61.7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia
- 61.8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima
- 61.9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)
- 61.10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)
- 61.11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak
- 61.12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

#### **D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK**

62. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
  - f. menilai kinerja Penyedia
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini
64. Peristiwa Kompensasi
- 64.1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 64.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

- 64.3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
- 64.4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi
- 64.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi

**E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**

- 65. Tenaga Kerja Konstruksi
  - 65.1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
  - 65.2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan
- 66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
  - 66.1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
  - 66.2. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
  - 66.3. Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
  - 66.4. Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
  - 66.5. PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

- 66.6. Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial :
- 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - 2) berkelakuan tidak baik; dan/atau
  - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK
- 66.7. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah
- 66.8. Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK

## **F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

67. Harga Kontrak
- 67.1. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
  - 67.2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
    - a. beban pajak;
    - b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
    - c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
    - d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.
  - 67.3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
68. Pembayaran
- 68.1. Uang Muka
    - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
    - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
    - c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.

- d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus)

#### 68.2. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK
- e. pembayaran harus memperhitungkan :
  - 1) angsuran uang muka
  - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya
  - 3) denda (apabila ada);
  - 4) pajak; dan/atau
  - 5) uang retensi

- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK
  - g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia
  - h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
  - i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan
- 68.3. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
- a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya
    - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen
    - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen
    - 4) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima

- 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah- tangankan oleh pihak manapun; dan
- 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia
- b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia
- c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%)
- d. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK

#### 68.4. Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
  - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
  - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK
- d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan

- dalam addendum kontrak
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja
- 69.1. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 69.2. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
  - b. PPK memberikan izin; atau
  - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
- 69.3. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK
- 69.4. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan
- 69.5. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan
70. Perhitungan Akhir
- 70.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak
- 70.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan

71. Penangguhan
- 71.1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- 71.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu
- 71.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia
- 71.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia

## **G. PENGAWASAN MUTU**

72. Pengawasan dan Pemeriksaan
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
- 73.1. PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 73.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
- 74.1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 74.2. Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya

pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

75. Perbaikan Cacat Mutu

- 75.1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 75.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
- 75.3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo
- 75.4. PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK

76. Kegagalan Bangunan

- 76.1. Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.2. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan

76.3. PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

## **H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

77. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
- 77.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan
- 77.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase
- 77.3. Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK
- 77.4. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak
78. Itikad Baik
- 78.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak
- 78.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

4.1 & 4.2 Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK	:	..... [diisi nama satuan kerja PPK]
Nama	:	..... [diisi nama PPK]
Alamat	:	..... [diisi alamat PPK]
Website	:	..... [diisi website PPK]
E mail	:	..... [diisi Email PPK]
Faksimili	:	..... [diisi Faksimili PPK]

Penyedia Jasa	:	..... [diisi nama badan usaha/nama KSO]
Nama	:	..... [diisi nama yang ttd surat penawaran]
Alamat	:	..... [diisi alamat Penyedia]
Website	:	..... [diisi website Penyedia]
E mail	:	..... [diisi Email Penyedia]
Faksimili	:	..... [diisi Faksimili Penyedia]

4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

**Untuk PPK:**

Nama : ..... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK]  
Berdasarkan Surat Keputusan PPK ..... nomor ..... tanggal ..... [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah PPK]

**Untuk Penyedia:**

Nama : ..... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan ..... nomor ..... tanggal ..... [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]

6.3 & 41.3 & 41.5 Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

27.1 Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 150 [seratus lima puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

31.8 Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [seratus delapan puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

33.1 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 [tiga puluh] hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

42.b Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

54.1.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPKOM adalah: - Melakukan perubahan lingkup pekerjaan - Menugaskan personil yang bukan diusulkan dalam penawaran - Melakukan perubahan Program Mutu
54.2.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : - Melakukan perubahan gambar - Melakukan perubahan Spesifikasi Teknis - Melakukan penggantian personil serta - Melakukan perubahan penggunaan peralatan
56	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PPK
63	Fasilitas	PPK tidak memberikan fasilitas apapun
64.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	TIDAK ADA
68.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
68.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin</li> <li>2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran Uang Muka serta Denda (apabila ada) serta pajak:</li> <li>- Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan</li> <li>- Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang</li> <li>- KPA dapat menahan sebagian dari pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan</li> </ul> </li> <li>3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan)</li> <li>- Adendum Kontrak</li> <li>- Dokumen perhitungan Mutual Chek (MC)</li> <li>- Pendukung perhitungan volume tagihan</li> <li>- Foto – foto hasil pelaksanaan pekerjaan</li> <li>- Bukti lunas pembayaran Asuransi (Astek)</li> <li>- Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga (untuk tagihan 100%)</li> </ul> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apabila didalam proses pembayaran terjadi kekeliruan perhitungan/kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara, Penyedia yang telah menerima kelebihan pembayaran tersebut berkewajiban mengembalikan sebesar yang telah diterimanya atau memperhitungkan pada tagihan berikutnya.</li> <li>5. Apabila kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksud angka 3) diketahui setelah jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, Penyedia tetap harus mengembalikan pembayaran tersebut ke Kas Negara.</li> <li>6. Semua bentuk dan jenis pembayaran akan dibayarkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>
68.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN)
75.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 ([satu perseribu] dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
76.1	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 3 [tiga] tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li> <li>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 3 [tiga] tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</li> </ol>
77.4	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak ini tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan sebagai Pemutus Sengketa adalah Pengadilan Negeri Semarang
